

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005108

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Fls nº

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA

Registro: PR-79330/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1700318071 Proc. nº

Ass.

Número da ART: 1720242961597 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/05/2024 Baixada em: 29/05/2024 Forma de registro:

Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

Contratante: MUNICÍPIO DE ANDARAÍ CNPJ: 76.235.761/0001-94

Rua: RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA Nº 100

Complemento: Bairro: JARDIM VESPER

Cidade: ANDARAÍ UF: PR CEP: 86380-000

Contrato: 016/2023 celebrado em 19/12/2022 Vinculado a ART: 1720234655066

Valor do contrato: R\$ 381.975,60 Tipo da contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional

Endereço da obra/serviço: RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA Nº 100

Bairro: JARDIM VESPER

Cidade: ANDARAÍ

UF: PR

CEP: 86380-000

Coordenadas Geográficas: -23,03973 X -50,226929

Data de início: 06/02/2023 Conclusão efetiva: 05/09/2023

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE ANDARAÍ

CNPJ: 76.235.761/0001-94

Atividade Técnica: 1- Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem, 65,26 M3; 2- Execução de obra de volume/área de aterros - terraplenagem, 40,08 M3; 3- Execução de obra de estrutura de concreto armado, 2,73 M3; 4- Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dren, 232,7 METRO; 5- Execução de instalação de cercamento por alambrado ou grades, 783 M2; 6- Execução de instalação de aplicação de outros materiais, 648 M2; 7- Execução de instalação de pavimentação, 187,88 M2; 8- Execução de instalação de sistemas de drenagem para obras civis dren, 648 M2; 9- Execução de instalação de sistema de esgoto/resíduos sólidos, 18 UNID; 10- Execução de obra de fundações profundas em tubulões, 69,6 METRO; 11- Execução de obra de estrutura de outros materiais, 47,7 M2; 12- Execução de obra de reforço de estruturas metálicas, 69,8 METRO; 13- Execução de obra de aplicação de outros materiais, 294,3 KG; 14- Execução de instalação de cabeamento por meios metálicos, 45 METRO; 15- Execução de instalação de cabeamento via outras tecnologias, 101 METRO; 16- Execução de instalação de cabeamento, 526 METRO; 17- Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 16 UNID; 18- Execução de obra de pavimentação, 41,97 M3; 19- Execução de obra de aplicação de concreto, 128,12 METRO; 20- Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos, 2 UNID.

Observações:

Execução da instalação do piso esportivo e obras civis Meu Campo.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo a folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 841 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720240005108

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240005108/2024

11/07/2024 09:23

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que
comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos
dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos
em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser
confirmada no site do Crea-PR, no endereço
<https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do
protocolo 192820/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no
Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva
ação penal.

Fls nº

978

Proc. nº

1970

Ass.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Fls nº 978Proc. nº 197Ass. HP**ANDIRÁ****PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100

e-mail: obras.urbanismo@andira.pr.gov.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Andirá, 21 de Junho de 2024.

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE ANDIRÁ, pessoa jurídica de direito público, situado na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, Jardim Vésper - Andirá/PR, CNPJ 76.235.761/0001-94, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu (sua) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Ione Elisabeth Alves Abib, portador da cédula de identidade R.G. n.º 1799461-1 - SSP/PR, inscrito no CPF sob o n.º 624.150.779-63, declara para todos os fins de direito o **aceite da instalação de Infraestrutura Urbana (Lazer) contendo Campo de Futebol com Grama Sintética e Paisagismo**, pela empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Termo de Contrato nº16/2023, cuja licitação foi promovida através de Pregão Eletrônico nº 020/2022, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Contrato: nº 16/2023

Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER) CONTENDO: CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA E PAISAGISMO E DEMAIS ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES NO PROJETO, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.

Endereço da Obra: RUA MAURO CARDOSO DE OLIVEIRA, 190

JARDIM VÉSPER - ANDIRÁ PR

CEP: 86380-000

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100

e-mail: obras.urbanismo@andarai.pr.gov.br

Fls nº 979

Proc. nº 1970

Ass. _____

ANDARAÍ

Contratante: Município de Andaraí

CNPJ: 75.235.761/0001-94


Responsável Técnico: Mauricio Belinowski Ferreira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil Carteira: PR-79.330/D RNP: 1700318071

ART: 1720242981597

Atividades executadas/Descritivo:

MEU CAMPINHO - GLOBAL		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		
	UN	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
SERVIÇOS PRELIMINARES		
LOCAÇÃO		
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018	UN	120,00
ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
BARRACÃO DE OBRA		
LOCAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS- 4,30 X 2,30 M	MES	6,00
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRs, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.	UN	1,00
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENOS COM MANTA GEOTÊXTIL		
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	M2	648,00
CAIXAS E COMPLEMENTOS		
CAIXAS DE GORDURA		
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	15,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00



Fls nº 980

Proc. nº 197

Ass. 82

ANDARAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100

e-mail: obras.urbanismo@andarai.pr.gov.br

SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	238,70
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	20,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem)	M3	53,63
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017 (Drenagem)	M3	28,56
FUNDAÇÕES		
ESTACA TIPO TUBULAO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	69,60
ESTRUTURAS		
FORMAS		
FORMAS PARA SUPERESTRUTURA		
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	47,70
ARMADURAS		
ARMAÇÃO CA-50 e CA-60		
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	105,90
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	188,40
CONCRETOS E GRAUTES		
ESTRUTURAL PREPARO MECANICO		
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,60
ESTRUTURAL USINADO		
CONCRETAGENS		
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,60
SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS		
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambreado)	M	69,60
ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		



Fls nº 281

Proc. nº 197

Ass. 80

ANDARAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100

e-mail: obras.urbanismo@andarai.pr.gov.br

ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M) - CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA	M2	756,00
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
ELETRODUTOS E CONEXÕES		
ELETRODUTOS PVC FLEXÍVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00
ELETRODUTOS AÇO GALVANIZADO		
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4") APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	36,00
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
ELETRODUTOS METÁLICOS FLEXÍVEIS		
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	45,00
CABOS		
ISOLAMENTO 0,5/1KV		
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	M	300,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2015	M	226,00
CAIXAS		
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00
REATORES E OUTROS		
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
HASTE DE ATERRAMENTO		
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	5,00
CORDOALHA		
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	10,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100


e-mail: obras.urbanismo@andaraí.pr.gov.br

Fls nº 982

Proc. nº 197

Ass. 80 ANDARAÍ

SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.	UN	1,00
MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO	UN	1,00
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e arruelas inox	UN	5,00
LUMINÁRIA TIPO PROJETO COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO	UN	8,00
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações Elétricas)	M3	11,50
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas)	M3	11,50
PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019	M3	9,57
LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	M3	32,40
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	M2	648,00
Fincadinha de concreto - (0x10x30cm=0,0171m³/m)	M	128,12
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	187,88
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)	M3	0,13
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV	PAR	1,00
MEU CAMPINHO - GLOBAL		R\$ 381.975,00



Fls nº 983

Proc. nº 197

Ass. 80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDARAÍ

ANDARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190

Fone/Fax: (0**43)3538-8100

e-mail: obras.urbanismo@andara.pr.gov.br

Período:

Início:06/02/2023

Entrega:05/09/2023

Atenciosamente,

ANDRÉ LUIZ MALUZI

CPF 060.915.539.33

Assinado de forma digital por

ANDRÉ LUIZ MALUZI CPF

060.915.539.33

Dados: 2024.06.28 14:35:54 -03'00'

André Luiz Maluzi

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

MUNICÍPIO DE ANDARAÍ

CNPJ: 76.235.761/0001-94

ANTONIO EDUARDO

BONIFACIO:01560716819

Assinado de forma digital por ANTONIO


EDUARDO BONIFACIO:01560716819

Dados: 2024.06.28 14:55:58 -03'00'

ANTONIO EDUARDO BONIFACIO

CREA SP 601664754

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, nº 38, Centro, Fone: (41) 3624.1244, CEP: 83850-000

Agudos do Sul – PR CNPJ 76.105.667/0001-10

Fls nº

984

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

nº

197

Ass.

Agudos do Sul, 05 de julho de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, com sede à Av. Brasil, nº 38, Centro, Agudos do Sul/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JESSÉ DA ROCHA ZOELLNER, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, declara para todos os fins de direito o aceite da **Instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR**, pela empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no CONTRATO Nº 27/2024, PRESTAÇÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de revestimento intertravado no piso do ginásio de esportes Tico Pires, com área total de 741,00m².

Endereço da Obra: Ginásio Tico Pires – Rua Paulino Fagundes, SN – Centro, Agudos do Sul PR
CEP: 83850-000

Quantidade: 741,00M²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Agudos do Sul
CNPJ: 76.105.667/0001-10

Responsável Técnico: Mauricio Belinovski Ferreira de Luca
Título Profissional: Engenheiro Civil – Carteira: PR-79.330/D – RNP: 1700318071
ART: 1720243349355

Atividades executadas/Descritivo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Instalação e fornecimento de revestimento intertravado projetado para utilização em ambientes internos, fabricado em polipropileno virgem de alto impacto, com medida mínima de 250mm x 250mm x 11mm (comprimento x largura x altura), cada placa com no mínimo, 24 conexões para melhor fixação entre elas. Com proteção ultravioleta, que garanta alta durabilidade, comprovada por ensaio de	741	m ²



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, nº 38, Centro, Fone: (41) 3624.1244, CEP: 83850-000

Agudos do Sul – PR CNPJ 76.105.667/0001-10

intemperismo, a serem apresentados juntamente com os documentos de habilitação, de 600 horas, com cor e integridade sem alteração, de acordo com a norma ASTM G 155, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro. as placas deverão contar com proteção anti-oxidação, antiestática e serem 100% resistentes à umidade; a superfície deve possuir tratamento antiderrapante que garanta estabilidade aos utilizadores tanto no seco quanto no molhado; é necessário também que as placas contenham sistema de absorção de impactos, fabricado em elastômero do tipo tpe, capaz de afastar a peça do solo entre 1 e 2mm, garantindo também estabilidade aos utilizadores; tal sistema deve ser fixado.

Fls nº

985

Proc. nº

1970

Ass.

Período:

Início: 07/06/2024

Entrega: 05/07/2024

Atenciosamente,

JESSE DA ROCHA

ZOELLNER:09157

538973

Assinado de forma digital
por JESSE DA ROCHA

ZOELLNER:0915738973

Data: 2024.07.15

10:11:03-00

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL

CNPJ: 76.105.667/0001-10

GUILHERME JOSE MOLETTA-05339182940

Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE

MOLETTA-05339182940

Data: 2024.07.16 10:42:53 -02'00'

Guilherme Jose Moletta

Eng. Civil CREA-PR 128.482/D

Responsável Técnico do Município



PREFEITURA DE

PATO BRANCO

Secretaria de Educação e Cultura

Fls nº 986

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Pato Branco, 20 de junho de 2024

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 76.995.448/0001-54, estabelecida na Rua Caremuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Robson Cantu, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 441.435.143-02, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto 702, Bairro Jardim das Américas, CEP 85.503-040, declara para todos os fins de direito o aceite da instalação de Grama Sintética pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, com as especificidades e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 170/2023, cuja licitação foi promovida através de Pregão Eletrônico nº 19/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Aceite Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA

Ata de Registro de Preços: 171/2023

Objeto do Contrato: aquisição Grama sintética e aquecimento Granulado de Borracha atendendo necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, com área de 540,00m².

Quantidade: 24m²

CEP: 85502-050

End.: CMEI Menino Deus - Rua Pedro Sander de Sá, nº 1067 - Menino Deus, Pato Branco PR

Quantidade: 400m²

CEP: 85503-060

End.: Escola Municipal Alvorada - Rua Castro Alves, nº 261 - São Cristóvão, Pato Branco PR

Quantidade: 120m²

CEP: 85504-316

End.: CMEI Vila Isabel - Rua Antonio Concettino, 84 - Vila Isabel, Pato Branco PR

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Pato Branco

CNPJ: 76.995.448/0001-54

Responsável Técnico: Mauricio Belinovsky Ferreira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR-79.330/DI - RNP: 1700318071



PREFEITURA DE
PATO BRANCO
 Secretaria de Educação e Cultura

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	Grama sintética para campo de futebol de várzea com cor verde (Preferência MPE Cota 75%) Altura total do fio de, no mínimo, 50mm, tipo de fio sintético polietileno (PE) em monofilamento ou fibrilado com, no mínimo 14.300 detex; Cor verde, maislinhas branco, com tratamento estabilizado e tratado anti UV e anti-estático; Distância de carreiras entreos fios (galga) de, no mínimo, 5/8 polegadas (158mm); Base primária constituída de polipropileno (PP) deverá possuir sistema entrelaçamento cruzado bidimensional com "microporos" para drenagem rápida da água da chuva, obedecendo especificação de 4 furos a cada 10,00 cm. Base secundária deverá ser resistente as intempéries e impactos gerados, constituída de poliuretano elastex enriquecido; Agulhadas 12 acada 10 cm Largura do rolo de 2,90m. Sistema de confecção tufting, Máquina, sistema anti-fogo. Enchimento de estabilização composto de camada de areia de sílica com granulometria de 0,5-1,0mm, com preenchimento de 0,020m³/m². Enchimento de amortecimento e conforto térmico composto de misto de orgânico em fibra de origem celulósica e borracha granulada pigmentados na cor verde com granulometria de 0,6mm a 3,7mm GZ. O preenchimento da camada de amortecimento e conforto térmico deverá ser de 12Kg/m², na proporção de 40% orgânico e 60% SBR. Mão de obra para instalação já inclusa	548,00m²
TOTAL GERAL:		548,00m²

Período:

Início: 17/11/2023

Entrega: 19/06/2024

Atenciosamente,

[Assinatura]
 Roberto Chota
 CPF: 441.043.916-68
 Município de Pato Branco
 CEP: 75.095-418/0001-54

Jusara Aparecida Santos Stizmann
 CPF: 815.558.572-49
 Secretária de Educação e Cultura

Fls nº 988
Proc nº 1970
Ass. _____

SEMEL
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER



SORRISO

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Sorriso, 14 de agosto de 2024.

À MMS PINOVA - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O MUNICÍPIO DE SORRISO, Estado de Mato Grosso, pela autoridade de direito público interno, com sede na Av. Porto Alegre, 3605, Caixa Postal 78890-000 - Sorriso/MT, inscrito sob o CNPJ nº 03.239.076/0001-62, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Esporte e Lazer, Sr. Emílio Brandão Junior, brasileiro, casado, inscrito no CPF/MT sob o nº 651.542.581-34, declara para todos os fins de direito a aceitação da instalação de Piso Multus Indoor pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades por ela propostas, ocorridas na Ata de Registro de Preços nº 256/2023, cuja licitação foi promovida através do Pregão Eletrônico nº 027/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Comissão de Apoio Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução L 127/2009 do COMTEC.

Contrato: nº 31/2024.

Objeto do Contrato: Adquirição de piso de borracha para parque infantil (playground), atendendo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, conforme termo de referência e anexos, com área de 1.926,00m².

Endereço da Obra: Arena Sorriso - Av. da Independência, 2221 - Jardim Aurora, Sorriso MT
CEP: 78890-000

Quantidade: 1.196,00m²

Endereço da Obra: Escola Conto Subida - Rua José de Almeida, 1139 - Flor do Cerrado, Sorriso MT
CEP: 78890-000

Quantidade: 130,00m²

Endereço da Obra: Ginásio Flor do Cerrado - Av. dos Reis, 1345 - Morada do Sol, Sorriso MT
CEP: 78890-000

Quantidade: 600,00m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A.
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Fls nº 989Proc. nº 197Ass. [assinatura]**SEMEL**
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE E LAZER**SORRISO**
MUNICÍPIOContratante: Município de Sorriso
CNPJ: 03.239.015/0001-02Responsável Técnico: Maurício Belizário Ferreira de Lencastre
Título Profissional: Engenharia Civil - Carteira: FIC 000.990.071 - RABP- 1700318071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	Piso Modular para áreas internas Indoor - produzido em polipropileno (pp) virgem de alto impacto, encaixe tipo macho-fêmea com comprimento mínimo: 14 conexões do tipo macho e 14 conexões do tipo fêmea por unidade de obra entre as placas, não serão aceitos peças com qualquer tipo de defeito, com espessura mínima de 25mm x 250mm x 10mm - pp virgem	1.926,00m ²
TOTAL GERAL:		R\$ 269.640,00

Período:

Início: 25/03/2014

Entrega: 08/08/2014

Atenciosamente,

[assinatura]
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Município de Sorriso
(CNPJ) 03.239.015/0001-02



Fls nº 990
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 056/2024

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o Nº 24.772.246/0001-40, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, neste ato representado pelo Secretário de Administração Sr. ALAN TOGNI, portador do RG Nº XX07450X SSP-MT e do CPF Nº XX3.538.401-3X, doravante denominada CONTRATANTE, ATESTA para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24 e inscrição estadual nº ISENT0, com sede na Avenida PAULISTA, Bairro Bela Vista, em São Paulo, no Estado de São Paulo, número de telefone (41) 4042-4960 doravante designada DETENTORA DA ATA, neste ato representada pelo Senhor(a) LAERCIO ALMADA FILHO, portador(a) do CPF nº XXX.919.467-XX e cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que desabone sua idoneidade.

SEGUE PLANILHA DA ATA Nº 060/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	UN.	QTD
2	PISO MODULAR PARA ÁREAS INTERNAS INDOOR - PRODUTO EM POLIPROPILENO (PP) VIRGEM DE ALTA IMPACTO E VARIANTE FEMEA COM NO MÍNIMO 14 CONEXÕES DO TIPO MACHO E 14 CONEXÕES DO TIPO FÊMEA PARA MELHOR FIXAÇÃO ENTRE AS PLACAS. NÃO SERÃO ACEITAS PEÇAS COM NÚMERO MENOR DE CONEXÕES. PEÇA COM MEDIDA MÍNIMA DE 250MM X 250MM X 11MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). O ESPAÇAMENTO ENTRE AS PLACAS DEVE SER PROJETADO DE TAL FORMA QUE A QUADRA, QUANDO MONTADA, TENHA AS MESMAS DIMENÇÕES DAS LINHAS PERIMÉTRICAS DOCELO, COM OS LIMITES DE PLACA, TAL EXIGÊNCIA SE FAZ NECESSÁRIA PARA AS QUADRAS TEREM NO MÍNIMO DUAS TORRES E NÃO SERÁ ADMITIDO QUE OS PISOS SEJAM PINTADOS DE FORMA CORRETIVA A DIVISÃO DAS QUADRAS DEVERÁ SER FEITA EXCLUSIVAMENTE COM PEÇAS INTEIRAS DOS PISOS, PEÇA COM PESO MÍNIMO DE 2000 PARA MAIOR ESTABILIDADE, PROTEÇÃO ULTRAVIOLETA (UV) COM SOLDADE À LUZ ALTA, COM PROTEÇÃO ANTI-OXIDAÇÃO, 100% DE RESISTÊNCIA À ULTRAVIOLETA, SUPERFÍCIE COM TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE ENTRE O CONTRAPISO E O PISO ESPORTIVO MODULAR DEVE SER INSTALADA MANTA PRÉ-FABRICADA DE BORRACHA COM ESPESURA DE 3mm, COM DENSIDADE DE 750KG/M3 A EMPRESA VENCEDORA DEVE REALIZAR O RECORTE DO PISO MODULAR COM O OBJETIVO DE CONTORNAR PERFEITAMENTE AS COLUNAS EXISTENTES, PARA A DEFINIR NO ATO DA EMISSÃO DA ORDEM DE EMPENHO O ORÇAMENTO, DEMARCAÇÕES DE LINHAS PARA FUTEBOL, HANDEBOL, BASQUETE, VOLEIBOL EM TINTA PU INDUSTRIAL COM PROMOTOR DE ADERÊNCIA, ACABAMENTO DAS BORDAS NO MESMO MATERIAL COM SUAVIZAÇÃO DA DEGRADAÇÃO ATRAVÉS DE RAMPAS DE ACESSO. OS PISOS INTERNOS, EXTERNOS, PARA ÁREAS ESPORTIVAS INTERNAS, EXTERNAS E PLAYGROUND DEVERÃO POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE QUE POSSIBILITE QUE SEJAM INTERCAMBIÁVEIS ENTRE SI OU SEJA, QUE POSSAM SER COMBINADAS EM ÁREAS CONTÍNUAS, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO JOGO.	PRÓPRIO PISO MODULAR	METRO QUADRADO	651,31

OBJETO DO CONTRATO: PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PISO ESPORTIVO EMBORRACHADO PARA GINÁSIOS E PISO ESPORTIVO EMBORRACHADO INTERTRAVADO PARA QUADRAS EXTERNAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT.

www.lucasdoriorverde.mt.gov.br

(65) 3549-1111

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque das Pátrias
CEP: 78466-153, Lucas do Rio Verde, MT
CNPJ 24.772.246/0001-40



Fls nº 991
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

DADOS DO CONTRATO

Vigência: 28/03/2024 até 28/03/2025.

Fiscal do Contrato: Eliei Bonfim Pereira dos Santos -- Matrícula: 2999.

Sem mais firmo o presente.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de Agosto de 2024.

Alan Togni
Secretário de Governo e Administração

www.lucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3549-2366

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque dos B. m.
CEP: 78466-153, Lucas do Rio Verde -
CNPJ 24.772.246/0001-11

Assinantes✓ **ALAN TOGNI**

Assinou em 19/08/2024 às 08:38, em nome de [nome] e possui a identidade vinculada com o CNP nº 14.331.442-7.

Eu, ALAN TOGNI, Assessor das Políticas Urbanas, inscrita no CNP nº 14.331.442-7, no ato da assinatura refere aos tipos de assinaturas mencionadas no documento para o qual se assina e não se trata de Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse

o site verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud e insira o código 3521

4Y3 16W ZLR E98



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
CNPJ: 91.573.048/0001-44

Fls nº 993
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Itacurubi, 20 de agosto de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE ITACURUBI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 91.573.048/0001-44, com sede na Avenida 10 de Abril, nº 910, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Gelso dos Santos Soares, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 011.936.690-81, declara para todos os fins de direito o **aceite da Instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR** pela empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Termo de Contrato nº 39/2024, com licitação através da Dispensa de Licitação nº 63/2024, Processo 073/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Contrato: nº 39/2024

Objeto do Contrato: Contratação da empresa especializada para o fornecimento e instalação de piso modular esportivo em polipropileno copolímero para adequação da quadra do ginásio estadual Vicente Goulart, com demarcação de três práticas esportivas, com área total de 612,35m².

Endereço da Obra: Ginásio da Escola Vicente Goulart - R. José Carlos Machado, 131, Itacurubi - RS

CEP: 97685-000

Quantidade: 612,35m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Página 1 de 2

Av. Dez de Abril, nº 910 - CEP: 97685-000 - Itacurubi/RS
(55) 3366-1025 - (55) 3366-1055



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
CNPJ: 91.573.048/0001-44

Fls nº 994
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

Contratante: Município de Itacurubi

CNPJ: 91.573.048/0001-44

Responsável Técnico: Mauricio Belinovski Ferreira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil Carteira: PR-79.330/D RNP: 1700318071

Atividades executadas/Descritivo:

Item	Especificação	Unidade	Qtde.	Valor total
1	Limpeza de piso com vassoura a seco AF_04/2015	M²	612,35	R\$ 410,27
2	Instalação, com fornecimento, de piso modular esportivo para área coberta com rampas de acabamento - demarcação das linhas de jogos com primer aderente e tinta pu. catalisada (para quadra poliesportiva, com até 4 demarcações) - 100% plástico polipropileno copolímero cp442 - dimensões 250 mm x 250 mm x 11 mm de altura - sistema de montagem modular com encaixe macho e fêmea - com manta de polietileno expandido de baixa densidade - dimensões da quadra: 18,50 m x 33,10 m.	M²	612,35	R\$ 78.686,98
TOTAL				R\$ 79.097,25

Período:

Início: 17/04/2024

Entrega: 07/07/2024

Atenciosamente, GELSO DOS

SANTOS

SOARES:01193

669081

Assinado eletronicamente
pelo(a) Sr(a) GELSO DOS
SANTOS
SOARES:01193669081
Data: 2024-03-20
12:03:42 -03'00'

Documento assinado digitalmente

CAROLINA FRANCO BUDEL

Data: 20/04/2024 12:00:44 -0300

Validar em: <https://validar.trf.gov.br>

Gelso dos Santos Soares
CPF sob o nº 011.936.690-81
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE ITACURUBI
CNPJ: 91.573.048/0001-44

Carolina Franco Budel
Engenheira Civil - CREA RS 243252
Prefeitura de Itacurubi - Matrícula 1308

Página 2 de 2

Av. Dez de Abril, nº 910 - CEP- 97655-000 - Itacurubi/RS
(55) 3366-1025 -- (55) 3366-1055

Fls nº 995**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA**

Avenida Bruno Pieczarka, 154 - Fone: (47) 3556-0044

administracao@santaterezinha.sc.gov.br CNPJ: 95.951.323/0001-77

CEP: 89199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Santa Terezinha, 26 de agosto de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no estabelecido na Avenida Bruno Pieczarka, nº. 154, centro de Santa Terezinha/SC, inscrito no CNPJ nº. 95.951.323/0001-77, neste ato representado pelo Prefeito Municipal; Sr. Genir Antonio Junckes, brasileiro, casado, inscrito no CPF nº. 425.225.289-04, declara para todos os fins de direito o aceite da instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR E OUTDOOR pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2024, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 07/2024, PROCESSO LICITATÓRIO 41/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEAL.

Objeto do Contrato: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR E OUTDOOR, PARA QUADRAS ESPORTIVAS, do Ginásio Municipal Osmar Capistrano e Escola Municipal Cristo Redentor; com recursos oriundos de transferência especial, proveniente da emenda parlamentar impositiva nº. 2038/2024 do estado de Santa Catarina e recursos próprios do município.

Endereço da Obra: Centro Integrado de Esportes e Lazer Osmar Capistrano - Parque Mata Nativa, Rod SC-114, Km 01, Santa Terezinha SC

CEP: 89199-000

Quantidade: 968,00m²

Endereço da Obra: Escola Cristo Redentor - Estrada geral distrito do Craveiro, SN - Santa Terezinha SC

CEP: 89199-000

Quantidade: 747,25m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A


CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Santa Terezinha

CNPJ: 95.951.323/0001-77

Responsável Técnico: Mauricio Belinowski Ferreira de Lucca

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR-79.330/D - RNP: 1700318071



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Avenida Bruno Pieczarka, 134 - Fone: (47) 3556-0044
administracao@santaterezinha.sc.gov.br CNPJ: 95.951.323/0001-77
CEP: 89199-000 - SANTA TEREZINHA - SANTA CATARINA

Fls nº 996

Proc. nº 197

Atividades executadas/Descritivo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Piso modular esportivo Indoor Fornecimento e instalação de piso modular indoor, composto por: Piso modular esportivo indoor 25cmx 25cmx1,2cm. Manta de absorção de impacto PEBD 3.00mm Rampa de acabamento Cantoneiras Demarcações de modalidades esportivas (futsal e voleibol).	968,00	m²
Piso modular esportivo Outdoor Fornecimento e instalação de piso modular outdoor, composto por: Piso modular esportivo outdoor 25cmx 25cm x 1,2cm. Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com NBR NM1300-3/2004 NBR 16071-2:2012) Rampa de acabamento Cantoneiras Demarcações de modalidades esportivas (futsal, voleibol, handebol, basquetebol).	747,25	m²

Período:

Início: 11/07/2024

Entrega: 23/08/2024

Atenciosamente,

GENIR
ANTONIO
JUNCKES:4
2522528904

Genir Antonio Junckes
CPF sob o nº 425.225.289-04
Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA
CNPJ: 95.951.323/0001-77

Carimbo da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Erikson Pocchi
Engenheiro Civil
CREA/SC 148658-0
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO



PREFEITURA DE JOÃO PINHEIRO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Fls nº 997
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

João Pinheiro, 23 de outubro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 16.930.299/0001-13, com sede na Pç. Cel. Hermógenes, nº 60, Centro, João Pinheiro/MG, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Edmar Xavier Maciel, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado nesta cidade, declara para todos os fins de direito o aceite da reforma do Ginásio Poliesportivo "Ayrton Senna" pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A. devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Contrato nº 266/2024, cuja licitação foi promovida através da Concorrência Eletrônica nº 004/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Contrato: 266/2024

Objeto do Contrato: Contratação de empresa com fornecimento de mão de obra, equipamentos, materiais, ferramentas e etc., para reforma do piso do Ginásio Poliesportivo "Ayrton Senna", localizado no bairro Jardim Bela Vista, Município de João Pinheiro – MG, conforme Convênio nº 1481001932/2023, celebrado entre o Município e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SODESE, consoante as especificações técnicas constantes do Memorial Descritivo, que integra este Edital, observadas as normas técnicas da ABNT.

End.: Ginásio Poliesportivo Ayrton Senna - Rua José Carlos Uchôa, SM - Jardim Bela Vista, João Pinheiro MG. CEP: 38.770-000

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de João Pinheiro
CNPJ: 16.930.299/0001-13

Responsável Técnico: Mauricio Belinovski Ferreira de Lucca
Título Profissional: Engenheiro Civil Carteira: PR-79.380/D RNP: 1700318071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO S/LDI	PREÇO UNITÁRIO C/LDI	PREÇO TOTAL
1	II-0-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA / ADM. LOCAL					
1.1	SETOP ED-28/29	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (6X3)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES # 6X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 25MM	UNID.	1,00	5.181,54	6.697,00	6.697,00

ASS

							Ass	
		INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS.						
							Sub- total	6.697,00
2	PIS-001	REFORMA DO PISO						
2.1	COTAÇÃO 01	REMOÇÃO DO PAVIMENTO E LIGAMENTO PARA RECEBER O SISTEMA DE PISO MODULAR.	M²	308,00	19,23	25,00		15.200,00
2.2	COTAÇÃO 02	PISO MODULAR ESPORTIVO INDOOR, INCLUSIVE RAMPA DE ACABAMENTO, CANTONEIRAS, MANTA PARA ABSORÇÃO DE IMPACTO EM PBD 3.0MM, DEMARCAÇÃO DE MODALIDADES ESPORTIVAS E MONTAGEM DO SISTEMA.	M²	608,00	139,19	181,00		110.048,00
							Sub- total	125.248,00
3	PIR-001	PINTURA						
3.1	SETOP ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE FISO METÁLICO E CAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²/MÊS	1.347,60	9,82	12,77		23.555,00
3.2	SETOP ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ/GUARDA CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M²	923,00	12,09	15,72		14.498,56
3.3	SETOP ED-50498	PINTURA LATEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA).	M²	1.714,83	13,87	19,03		32.001,44
							Sub- total	70.055,00
TOTAL GERAL DA OBRA								R\$262.000,00

Periodo:

Início: 09/03/2014

Entrega: 02/10/2024

Atenciosamente,

EDMAR XAVIER
MACIEL 87029
146620

Edmar Xavier Masciel
Prefeito Municipal

Município de João Pinheiro
CNPJ: 16.930.299/0001-13

VINICIUS AUGUSTO
GRADIM:087741956

62

Minicius Augusto Gradlin
Engenheiro Civil – CREA/MG Nº 189.257-D
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA - RS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Fls nº 999
Proc. nº 197
Página 1
CAT-SEM-REGISTRO DE ATESTADO
2053492

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA
Registro: PR79330 RNS: 1300139531
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: 12844648 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 23/10/2023 Baixada em: 19/12/2023
Forma de Registro: Permissão Única - Substituto / Principal

Empresa Contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS L

Contratante: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES CPF/CNPJ: 92868850000124 Nº: 943

Rua: Rua PROFESSOR EDUARDO THÁCIO FERREIRA

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL

Bairro: Centro

Cidade: São José dos Ausentes

UF: RS

CEP: 95280000

Contrato: Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 105.370,20

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: CONFERIR RESUMO DO CONTRATO Nº: 0

Complemento:

Bairro:

Cidade: SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

UF: RS

CEP: 95280000

Data de Início: 22/06/2023 Previsão de Término: 20/10/2023

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESPORTIVO

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

CPF/CNPJ: 92868850000124

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - INSTALAÇÕES

CONFERIR RESUMO DO CONTRATO Nº 12844648

907,26

m²

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

fornecimento e instalação de piso modular de poliamidado nos endereços:

1-Rua Alvedorino A. Pereira, 326- Centro, São José dos Ausentes - Rio Grande do Sul

2-Santa Terezinha Faxinal Preto - Distrito Rural, São José dos Ausentes - RS CEP: 95280-000.

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 2053492

do dia Janeiro de 2024. Hora 14:27:19

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.

Esta CAT não comprova o registro do atestado emitido pelo contratante da obra ou serviço referenciado na Lei nº 8.666/1993.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul
Rua: São Luís 77 - Porto Alegre, RS, CEP 91020-170 - www.crea-rs.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240020231

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) abaixo discriminada(s):

Fls nº

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA

Registro: 6089880671-SP

Título Profissional: Engenheiro Civil

Proc: nº

Ass:

Número ART: 2620241599629 Tipo de ART: OBRERA OU SERVIÇO Registrada em: 16/09/2024 Baixada em: 27/09/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Contratante: Prefeitura Municipal de Campinas CNPJ: 51.885.242/0001-40

AVENIDA Archista No. 200

Complemento: Bairro Centro

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13015100 PAIS: BRASIL

Contrato: 407/2023 Celebrado em: 21/07/2023

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 481.490,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Laurinda Romão Coelho e Rua Doutor Nicolau Sanches Júnior No. s/n

Complemento: Bairro Jardim Santa Bárbara

Cidade: Campinas UF: SP CEP: PAIS: BRASIL

Data de início: 12/07/2024 Conclusão Efetiva: 14/08/2024

Finalidade: ESPORTIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Campinas CNPJ: 51.885.242/0001-40

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de instalação de cercas metálicas, alvenaria ou grades. 372,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de instalação de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais. 10850,00000 lumen. 3) Execução, Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos. 2,00000 unidade. 4) Execução, Execução de instalação de estrutura metálica para fins diversos. 1,00000 unidade. 5) Execução, Execução de instalação de estrutura metálica para arquibancadas. 40,00000 metro. 6) Execução, Execução de instalação de aplicação de outros materiais. 648,00000 metro quadrado. 7) Execução, Execução de instalação de aplicação de outros materiais. 210,00000 metro quadrado.

Observações

Fornecimento e montagem/instalação de "Modulo Esportivo - Areninha" com 1.100m² totais, incluindo, quadra de Futebol Society em grama sintética e quadra de Basquete de conjunto modular com iluminação em LED, composto por 372,00m² de Alvenarias com portão e estrutura de sustentação, contornando a quadra de grama sintética com 648,00m² e 2 travessas de futebol em metal, dois patamares de estrutura metálica de arquibancadas com guarda corpo contendo 40,00m, área de basquete com 1 tabuleta de madeira 210,00m² de pintura no piso com tinta PU, instalação elétrica de baixa tensão com 10 projetores em Led e equipamentos com total de 10.850 lumens.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área de Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente Certidão.

Data do término da obra/serviço - 23/09/2024

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 12 vietas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No 2620240020231

15/10/2024 15:35:36

Autenticação Digital: CAdgrFpu3ysTfL3mxTfClnk0ag5AUK51a

A CAT é válida e produz efeitos e não é alterada pelo profissional que a emite, nem pelo CREA.

A CAT é válida e produz efeitos e não é alterada pelo profissional que a emite, nem pelo CREA.

A CAT é válida em toda território nacional.

A CAT é válida e produz efeitos e não é alterada pelo profissional que a emite, nem pelo CREA.

A CAT é válida e produz efeitos e não é alterada pelo profissional que a emite, nem pelo CREA.

A CAT é válida e produz efeitos e não é alterada pelo profissional que a emite, nem pelo CREA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua Antero de Figueiredo, 150 - Jd. Paulista - CEP: 01452-920
Fone: (11) 2011-2011 - www.crea.org.br - www.crea.org.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Gabinete do Secretário

Proc. nº

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Campinas, 24 de setembro de 2023.

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O Município de Campinas, por intermédio da Secretaria de Esportes, inscrito no CNPJ/MF sob nº 51.885.242/0001-40, Av. Anchieta, 700 – Centro, Campinas SP, representado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer, Sr. Fernando Lourenço Vanin, inscrito no CPF nº 275.615.948-44, declara para todos os fins de direito o aceite da implantação de Módulo Esportivo - Areninha, pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificações e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços nº 407/2023, cuja contratação foi promovida através de Pregão Eletrônico nº 89/2023, Processo PMC.2022.00078055-11, dando-lhe plena conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Aproveitamento Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.132/2009 da CONFEA,

Ata de Registro de Preços: nº 407/2023.

Objeto do Contrato: Registro de Preços de fornecimento e instalação de módulos esportivos.

Endereço da Obra: Rua Leônidas Pomarico Coelho e Rua Odeir Nicolau Sanches Júnior, SN – Jd. Santa Bárbara, Campinas SP

CEP: 13064-071

Quantidade: 1.000,00m²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Campinas

CNPJ: 51.885.242/0001-40

Responsável Técnico: Mauricio Bernovski Ferreira de Lora

Título Profissional: Engenheiro Civil Carteira: PA-75.350/D RNP: 1700318071

ART: 2620241599628



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Gabinete do Secretário

Fls nº 1002Proc. nº 197Ass. [assinatura]

Atividades executadas/Descritivos:

- 648m² de grama sintética;
- 2 unid. De equipamentos para quadra de futebol;
- 372m² de estrutura de alambrados;
- 10.850 lumens iluminação projetor para futebol;
- 40m de arquibancadas;
- 224m² de pintura de piso da quadra de basquete;
- 1 unid. de tabela e arca de basquete com suporte;
- 10.850 lumens de iluminação projetor para basquete 3x3

Área total da obra = 1.100m²

Período:

Início: 12/07/2024

Entrega: 23/09/2024

Conforme declaração emitida pelo engenheiro Fábio da Silva Gomes Ferreira CREA-RJ 2019104827 referente a visita de vistoria técnica executada na data de 23 de setembro de 2024, que certifica que a instalação está de acordo com o que foi contratado.

Atenciosamente,

Marcelo Bacchioli Sassi

CPF: 207.638.998-97

Diretor Administrativo em Exercício

Fls nº 1003Proc. nº 1970Ass. [assinatura]

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE VISTORIA

QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA,
ILUMINAÇÃO E CONTRAPISO

Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Endereço: Av. Paulista, 1471 – Conj. 511, Sala 02 – Bela Vista – São Paulo/SP

CEP: 01.311-927

Cliente: Município de Campinas

CNPJ: 51.885.242/0001-40

Endereço: Av. Anchieta, 200 – Centro, Campinas SP

CEP: 13015-904

Endereço da obra: Praça do bairro Santa Barbara - Rua Laurinda Pomaro Coelho e
Rua Doutor Nicolau Sanches Júnior, SN – Jd. Santa Barbara, Campinas SP

CEP: 13064-071

Responsável Técnico: Mauricio Belinovski Ferreira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil

Carteira: PR-79 330/D RNP: 1700318071

ART nº: Obra/Serviço: 2620241599629

Fls nº

1004

Proc. nº

1977

Ass.

1. OBJETIVO

Eu, Pablo da Silva Gomes Ferreira, CREA-RJ: 2019104827 declaro neste documento o parecer técnico após inspeção e verificação de instalação de grama sintética, equipamentos para quadra futebol, alambrado, iluminação, arquibancadas, pintura do piso da quadra de basquete, tabela e aro de basquete. Localizado na Praça do bairro Santa Barbara - Rua Laurinda Pomaro Coelho e Rua Doutor Nicolau Sanches Júnior, SN - Jd. Santa Barbara, Campinas SP, CEP.: 13064-071.

2. DAS ATIVIDADES

Fornecimento e instalação de:

- Grama Sintética;
- Equipamentos para Quadra Futebol;
- Estrutura de Alambrados;
- Iluminação Projetor LED - Futebol;
- Arquibancadas;
- Pintura do piso da quadra de Basquete;
- Tabela e aro de Basquete com suporte;
- Iluminação Projetor LED - Basquete 3x3.


Área Total: 1.100,00m²

Início: 12/07/2024 Entrega: 23/09/2024

3. DA ANÁLISE

A análise foi baseada em visita e inspeção do local onde a obra foi realizada. Abaixo apresento algumas fotos registradas no local:

Fls nº 1005
Proc. nº 193

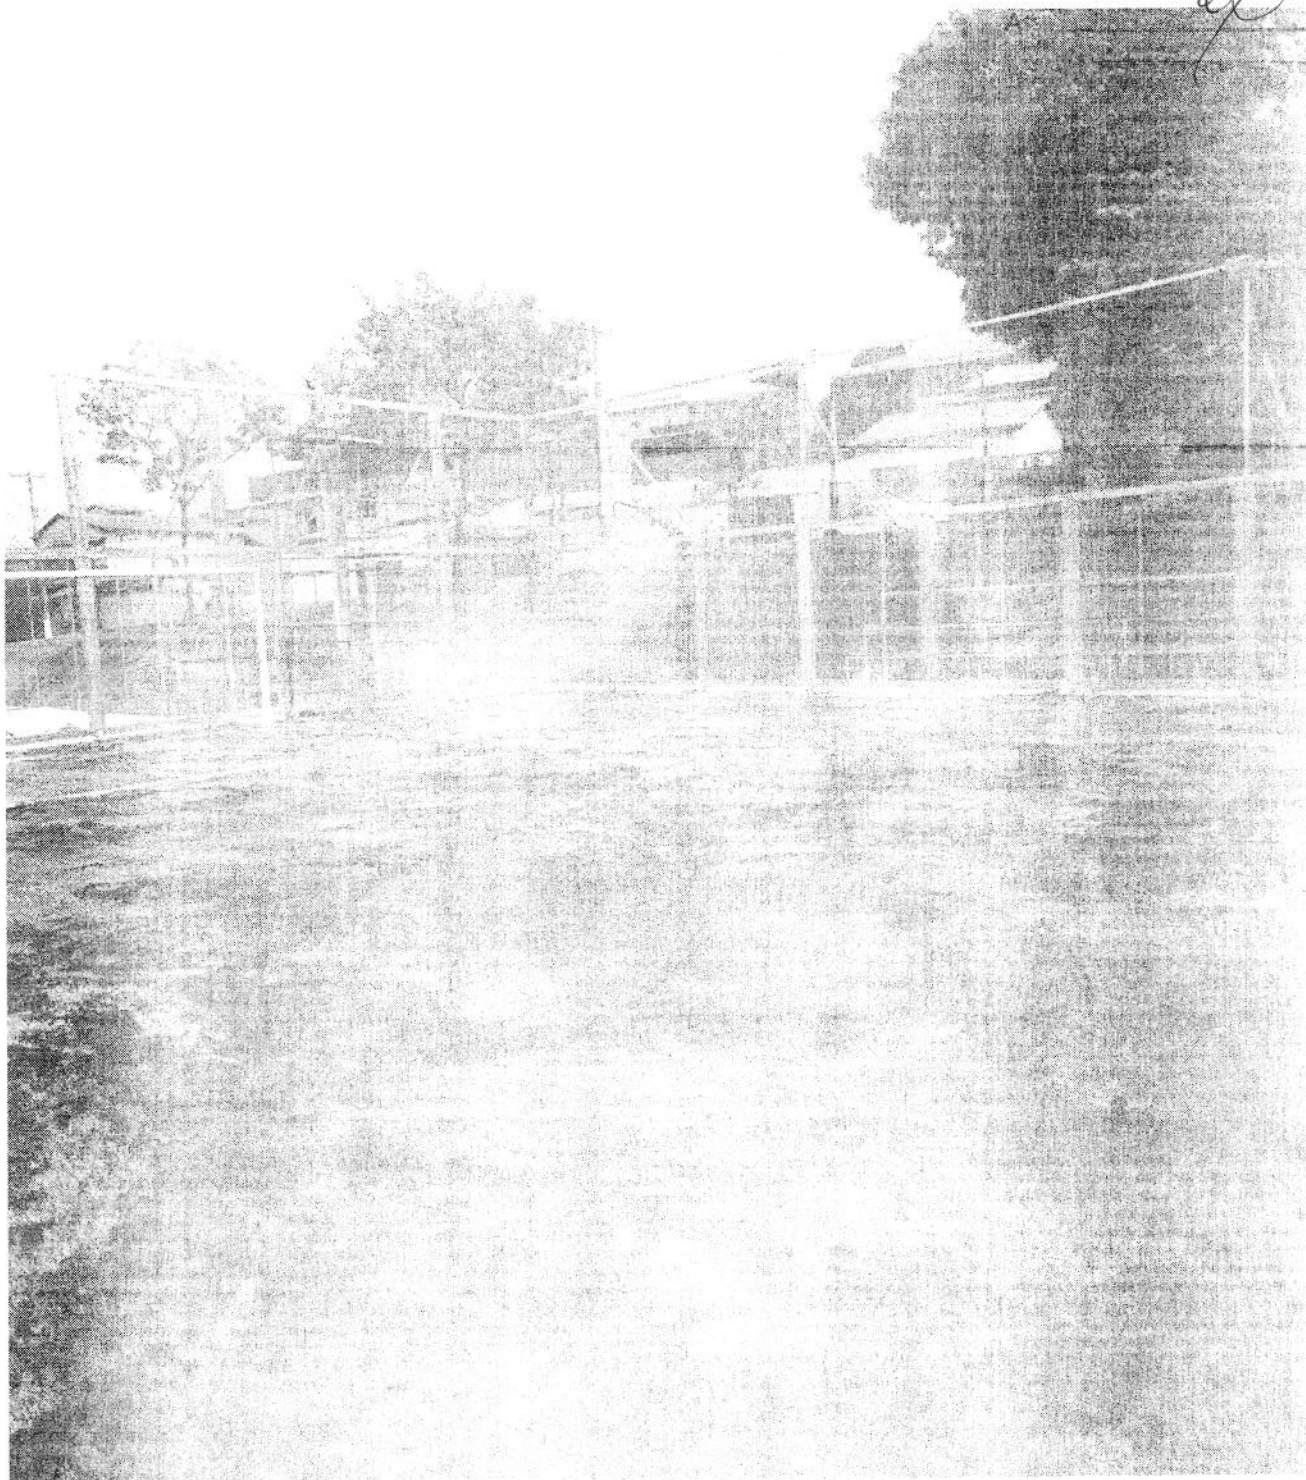

Fls nº 1006

Proc. nº 197

Ass. hy



Fls nº 1007

Proc. nº 197

Ass. ex



Página 6 de 10

Fls nº 1008

Proc. n° 1977


Ass. _____



Fls nº 1009

Proc. nº 197

Ass. [Signature]

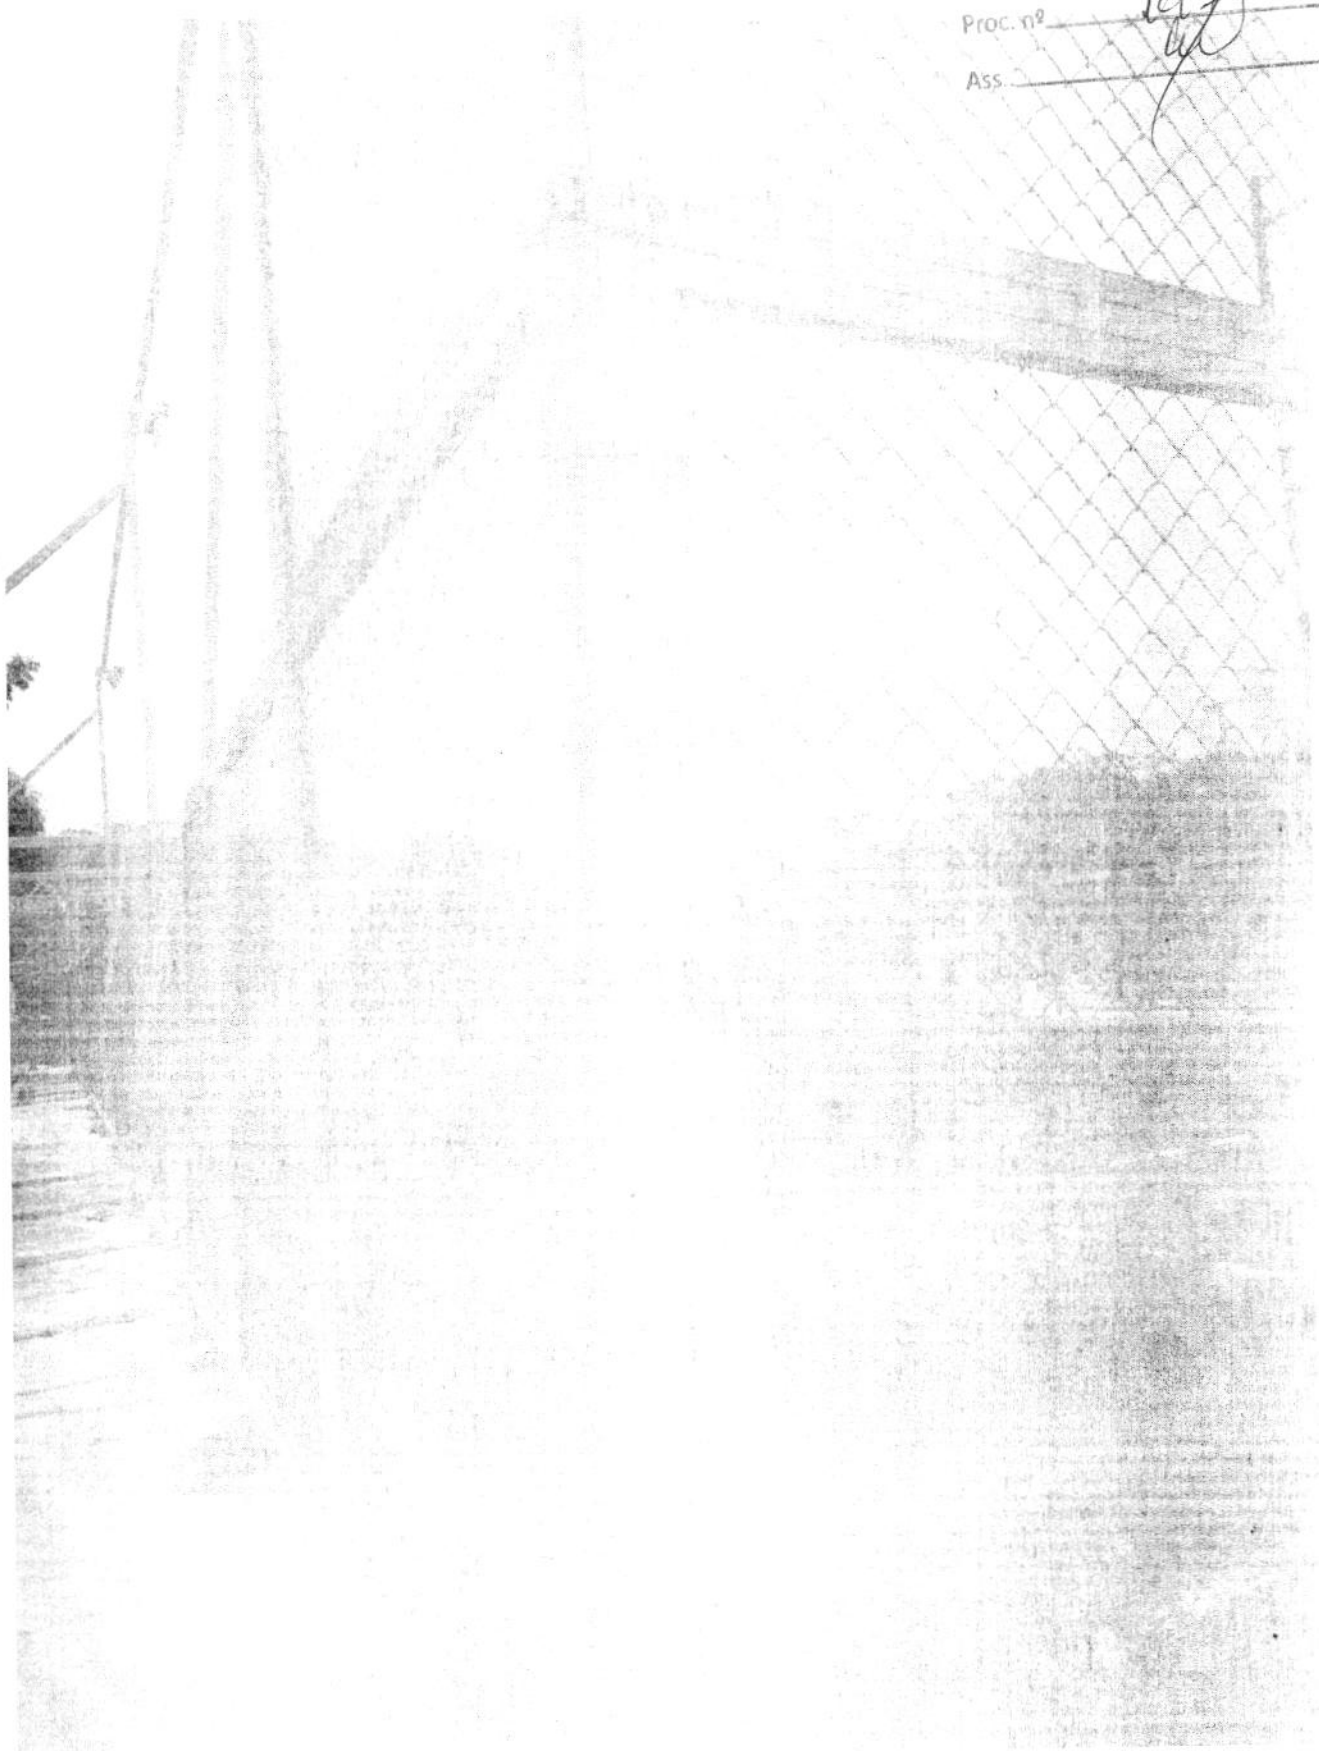



Arquivo de Imagens - 197 - 1009 - 1072

Página 8 de 10

Fls nº 1010

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

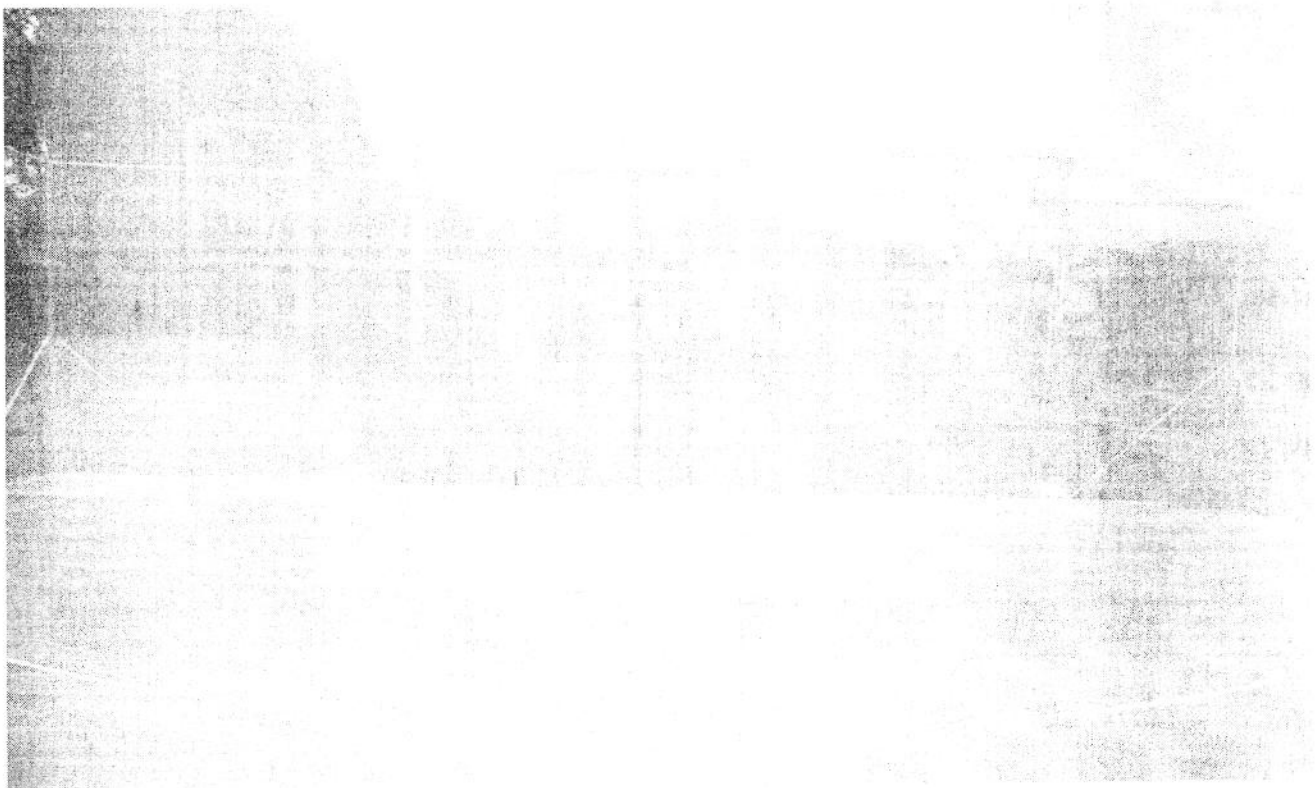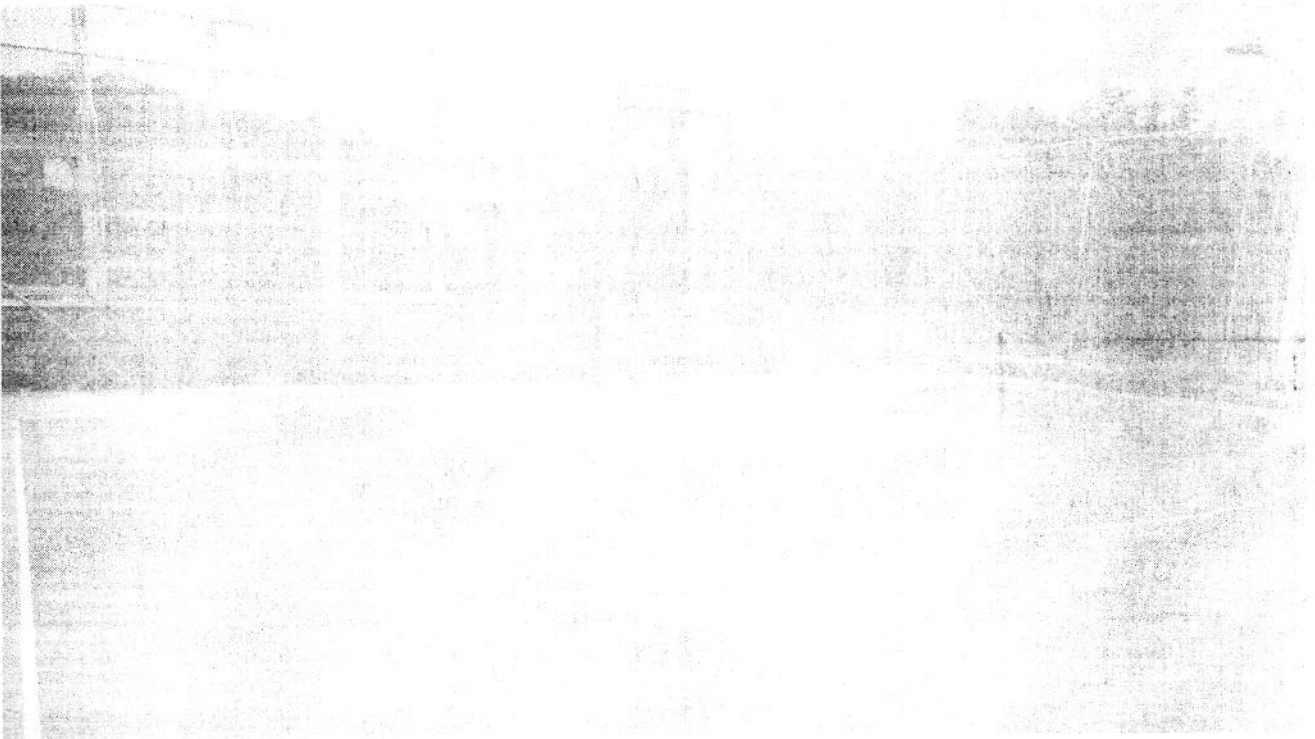


REPRODUÇÃO DE FOTOGRAFIA DO LUGAR DO CASO

Página 9 de 10

Fis nº 1011

Proc. nº 1970

Ass. [Signature]

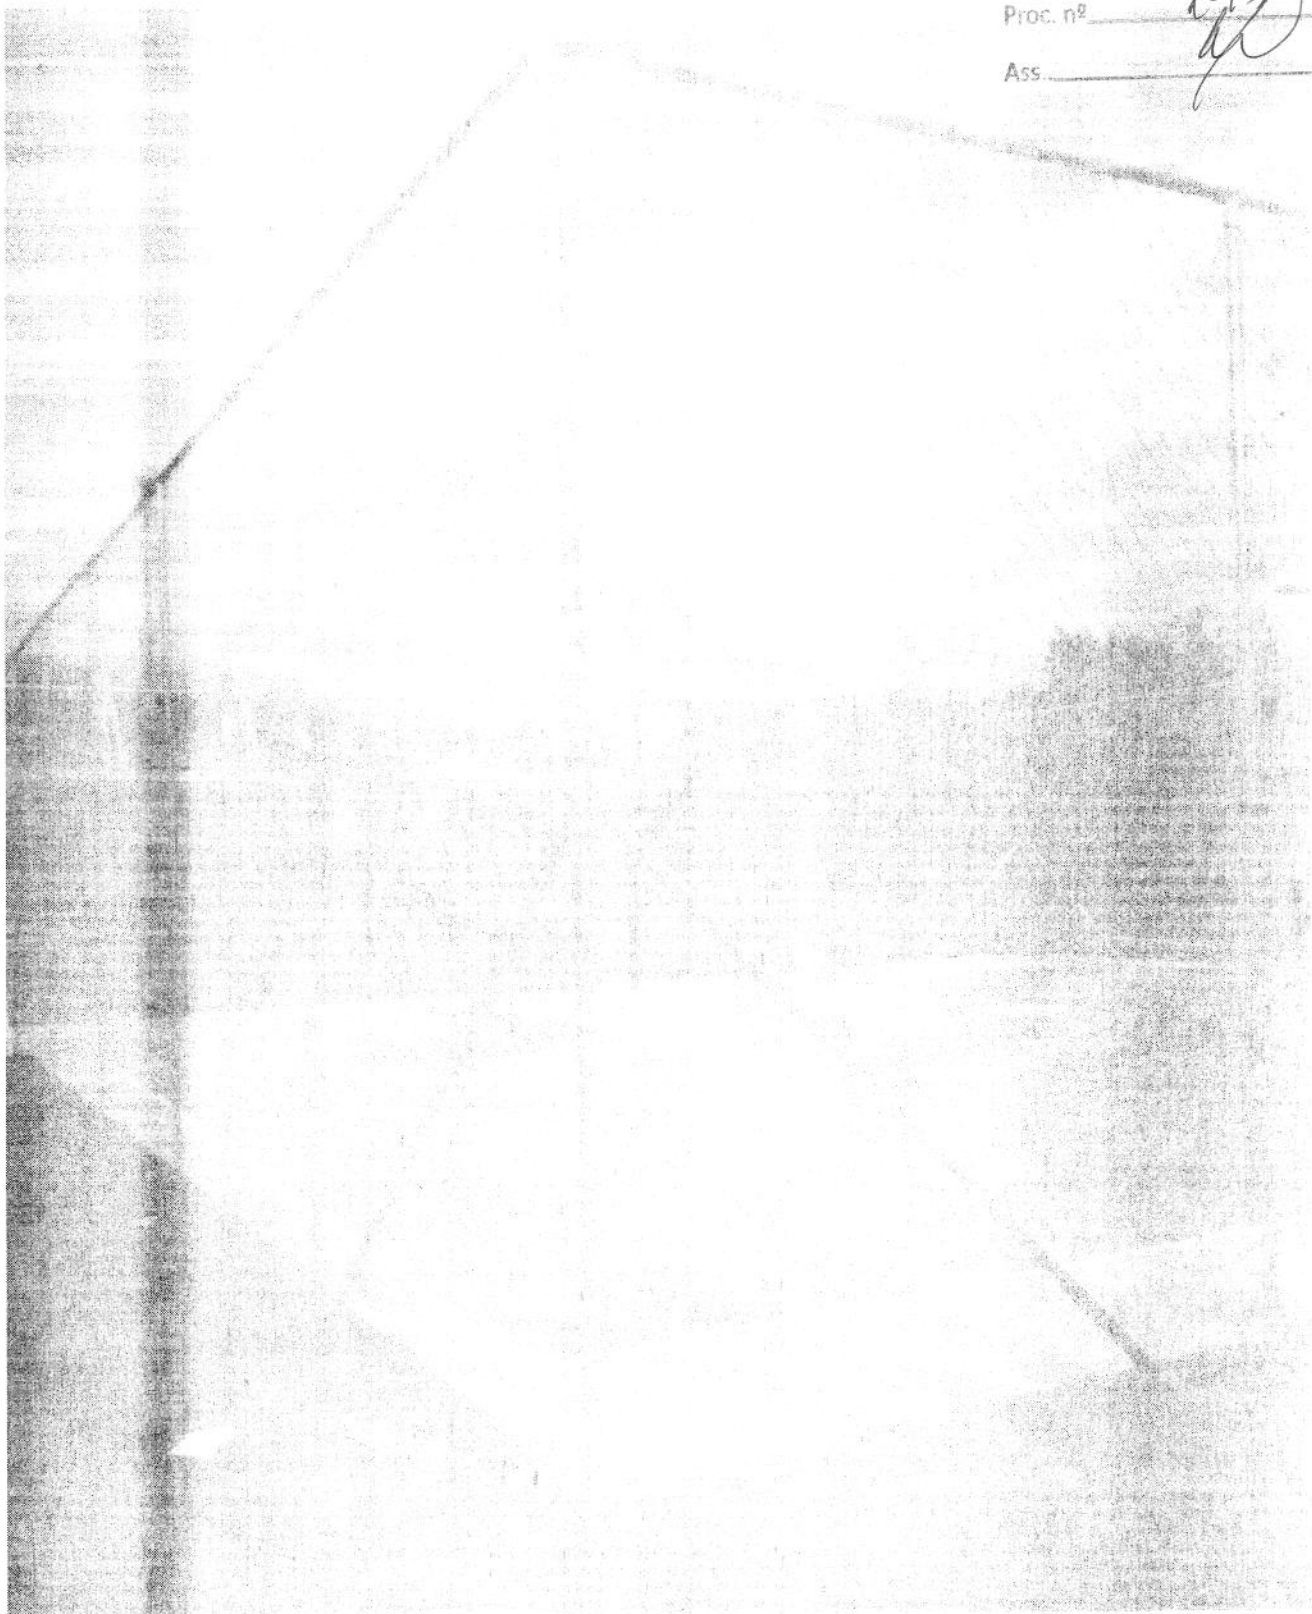

Página 10 de 11

Fls nº 1012
 Proc. nº 197
 Ass. CE

4. PARECER

O parecer de este profissional para a obra que consta no projeto de obra prestado está de acordo com o que foi contratado. Não se observou nenhuma falha na execução das obras, na grama sintética, equipamentos para quadra futebol, alambrado, iluminação, gradeado de piso, pintura do piso da quadra de basquete, tabela e aro de basquete, por toda a área externa de 1.100,00m².

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2024

 [Assinatura]
 [Assinatura]

Fis nº 1013Proc. n° 19A

.....

Ass. _____

19/2024Baixada em: 20/09/2024

CNPJ: 51.385.242/0001-40

No. 200

REVISTA DE DIREITO PÚBLICO

No.: 1327

Observações:

Fornecimento e montagem instalação de "Banco esportivo - X-PRO-J" com 70m comprimento, incluindo quadra de Futebol Society em grama sintética e quadra de Basquete 3x3 conjunto modular com iluminação em LED composto por 82 lâmpadas de 60W cada com portão e estrutura de sustentação contornando a quadra de grama sintética.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Gabinete do Secretário

Fls nº 1014

Proc. nº 197

Ass. _____

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Campinas, 18 de setembro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O Município de Campinas, por meio do Departamento de Esportes, inscrito no CNPJ/MF sob nº 51.885.242/0001-90, Av. Amílcar 12, Centro, Campinas SP, representado pelo Secretário Municipal de Esportes e Lazer Sr. Fernando Lourenço Vanin, inscrito no CPF nº 275.615.948-44, declara, para todos os fins de direito, a conclusão da implantação de Módulo Esportivo - Areninha, pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos na Lei nº 6.000 de 16 de maio de 2023, cuja licitação foi promovida através do Pregão Eletrônico nº 09/2023 e Processo PMO 2022.00078055-11, dando por fim a conclusão da obra.

Ademais para fim de registro de Conclusão de Obra, o Técnico registra-se abaixo para atendimento da Resolução nº 137/2016 da FPM.

Ata de Registro de Preços nº 107/2023

Objeto do Contrato: Registro de preços de fornecimento e instalação de módulos esportivos.

Endereço da Obra: Praça do Bairro Santa Mônica - R. José Gusmão Stuart, 1327 - Jd. Santa Mônica, Campinas SP

CEP: 13.082-010

Quantidade: 1.100,00m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 Gabinete do Secretário

Fls nº 1015
 1970

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instruções Esportivas S.A.

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Campinas

CNPJ: 51.885.242/0001-40

Responsável Técnico: Maurício Belchowsky de Almeida

Título Profissional: Engenheiro Civil - (Carteira: PR 79.334/D - RNP, 1700318071

ART: 2620241384431

Atividades executadas/Descrição:

648m² de grama sintética;

2 unid. De equipamentos para quadra de futebol;

372m² de estrutura de alambrados;

10.850 lumens Iluminação projetor para futebol;

40m de arquibancadas;

224m² de pintura do piso da quadra de basquete;

1 unid. de tabela e aro de basquete com suporte;

10.850 lumens de iluminação projetor para basquete 3x3;

Área total da obra = 1.100m²

Período:

Início: 10/07/2024

Entrega: 18/09/2024

Conforme declaração emitida pelo engenheiro Pablo da Silva Gomes Ferreira CREA-RJ 2019104827 referente a visita de vistoria técnica executada no dia de 18 de setembro de 2024, que certifica que a instalação está de acordo com o que foi contratado.

Atenciosamente,

Roberto Aguiar de Moraes
 CPF: 240.71.478-17
 Diretor Administrativo
 Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Fls nº 1016
Proc. nº 1979
Ass [assinatura]

DECLARAÇÃO TÉCNICA DE VISTORIA

QUADRA ESPORTIVA COM GRAMA SINTÉTICA, ALAMBRADO, ARQUIBANCADA, ILUMINAÇÃO E CONTRAPISO

Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Endereço: Av. Paulista, 1471 – Conj. 511, Sala 02 – Bela Vista – São Paulo/SP

CEP: 01.311-927

Cliente: Município de Campinas

CNPJ: 53.385.242/0001-40

Endereço: Av. Anchieta, 200 – Centro, Campinas SP

CEP: 13015-904

Endereço da obra: Praça do bairro Santa Monica – Rua Gustavo Stuart, 1327 – Jd.

Santa Monica, Campinas SP

CEP: 13.082-010

Responsável Técnico: Maurício Belinovski Ferreira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil

Carteira: PR-79.830/D RNP: 1700918071

ART nº: Obra/Serviço - 2620241584431

Fls nº 1017
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

1. OBJETIVO

Eu, Pablo da Silva Gomes Ferreira, CREA-RJ: 20191048-27 declaro neste documento o parecer técnico após inspeção e verificação de instalação de grama sintética, equipamentos para quadra futebol, alambrado, iluminação, arquibancadas, pintura do piso da quadra de basquete, tabela e aro de basquete. Localizado na Rua Gustavo Stuart, 1327 – Jd. Santa Monica, Campinas SP, CEP: 13.082-010.

2. DAS ATIVIDADES

Fornecimento e instalação de:

- Grama Sintética;
- Equipamentos para Quadra Futebol;
- Estrutura de Alambrados;
- Iluminação Projetor LED - Futebol;
- Arquibancadas;
- Pintura do piso da quadra de basquete;
- Tabela e aro de Basquete com suporte;
- Iluminação Projetor LED - Basquete 3x3.

Área Total: 1.100,00m²

Início: 10/07/2024 Entrega: 18/09/2024

3. DA ANÁLISE

A análise foi baseada em visita e inspeção do local onde a obra foi realizada. Abaixo apresento algumas fotos registradas no local:


Fls nº 1018

Proc. nº 197

Ass. [assinatura]





Fls nº 1019
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

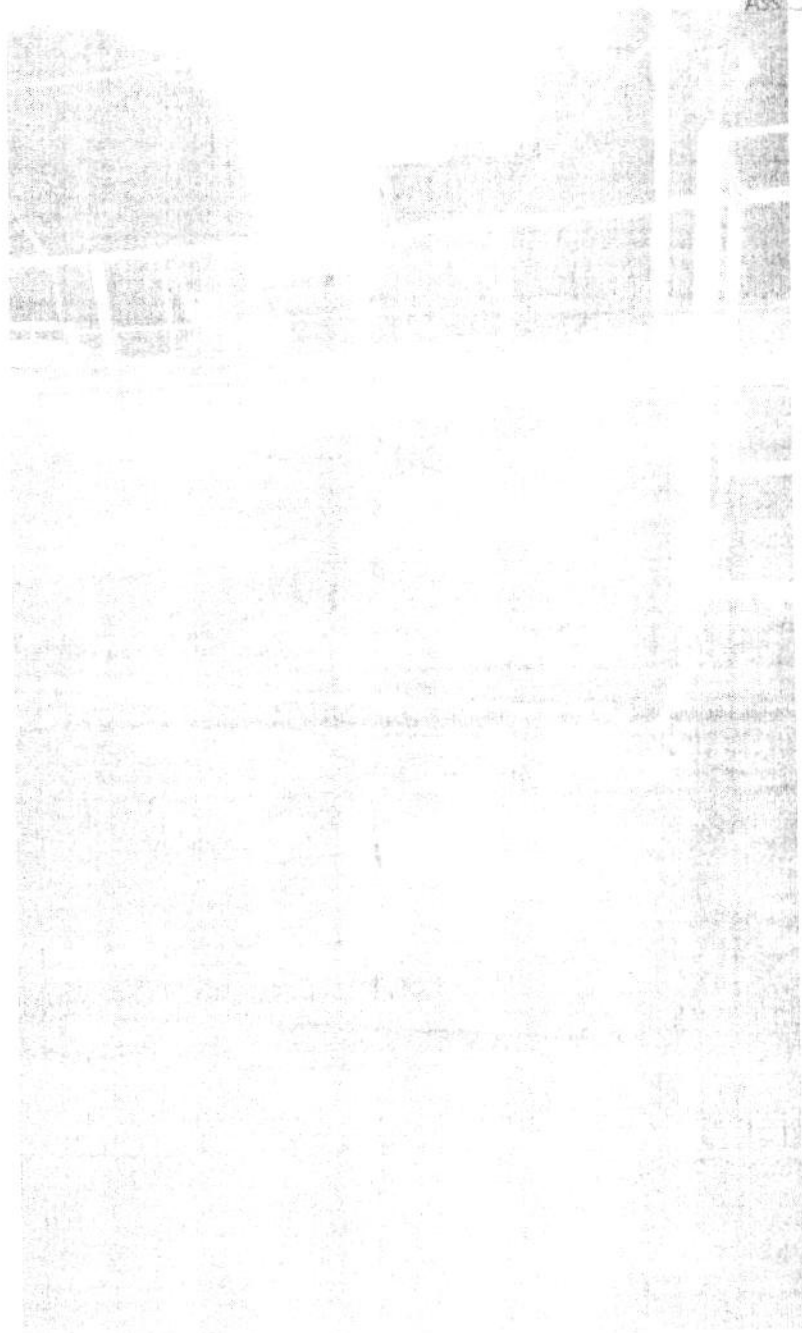

Proc. n° 197


ASS: _____

Fls nº 1021
Proc. nº 1970
Ass.

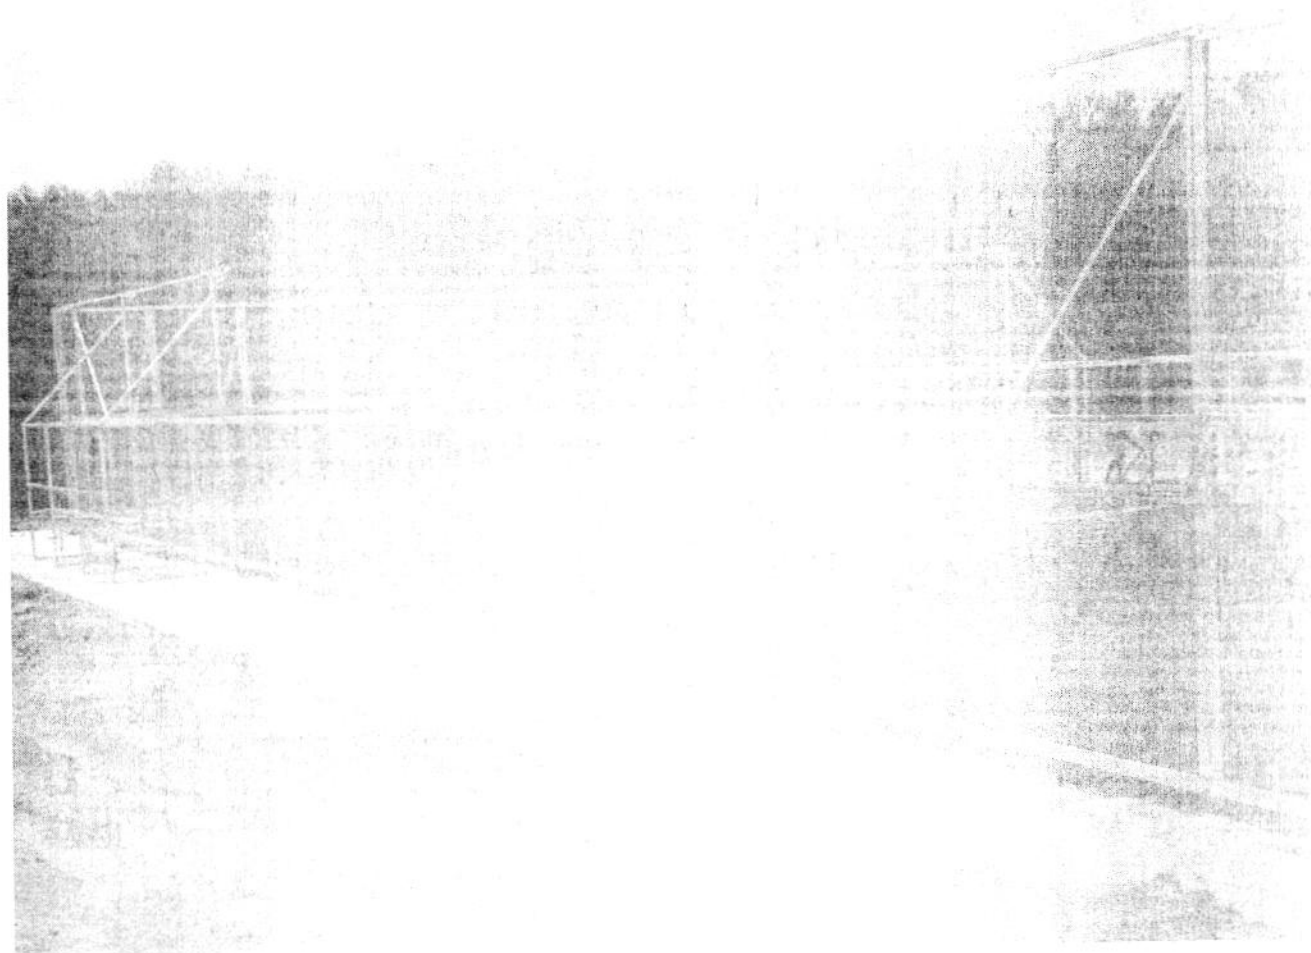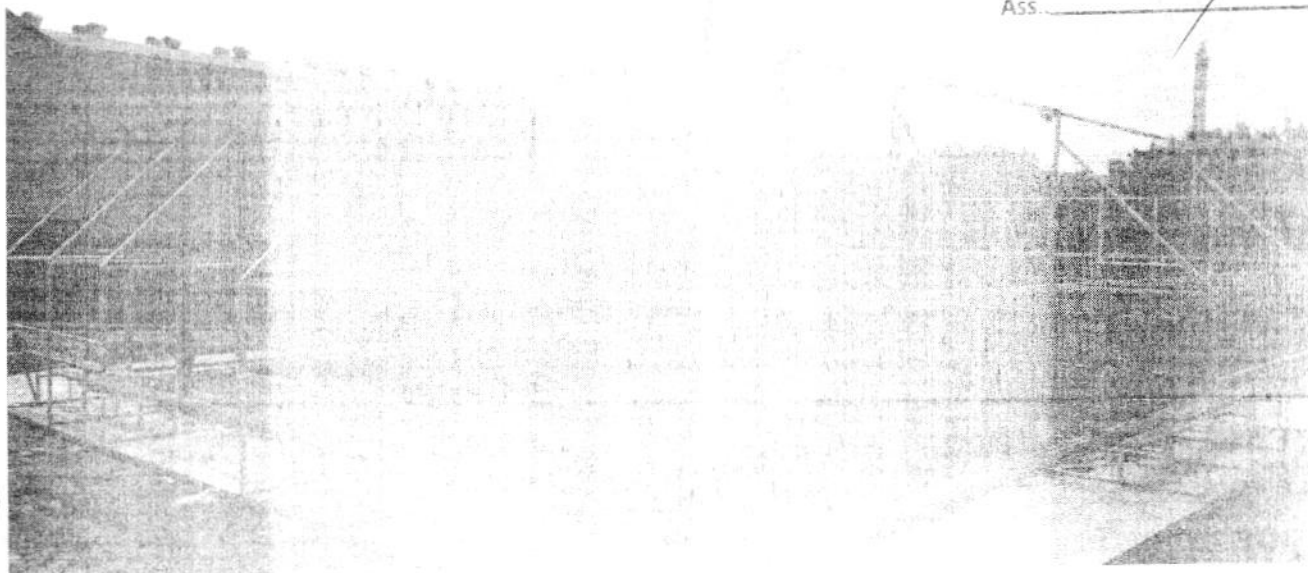



Página 7 de 9

Fls nº 1022
Proc nº 197
Ass. ay

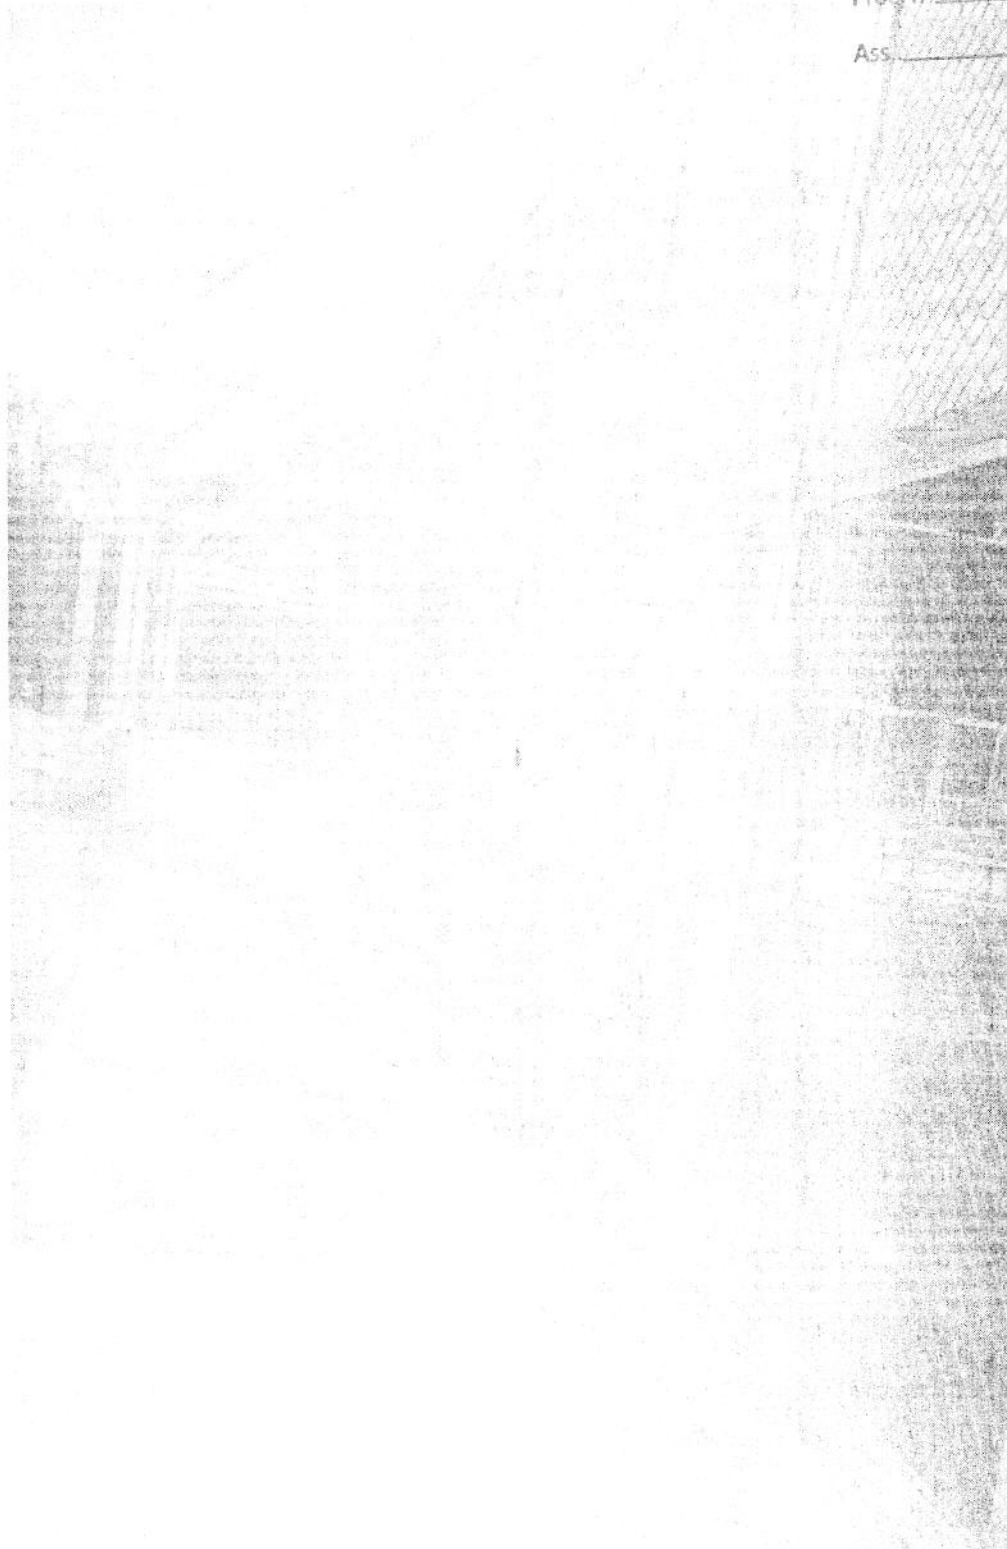

Página 8 de 8

Fls nº 1023
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

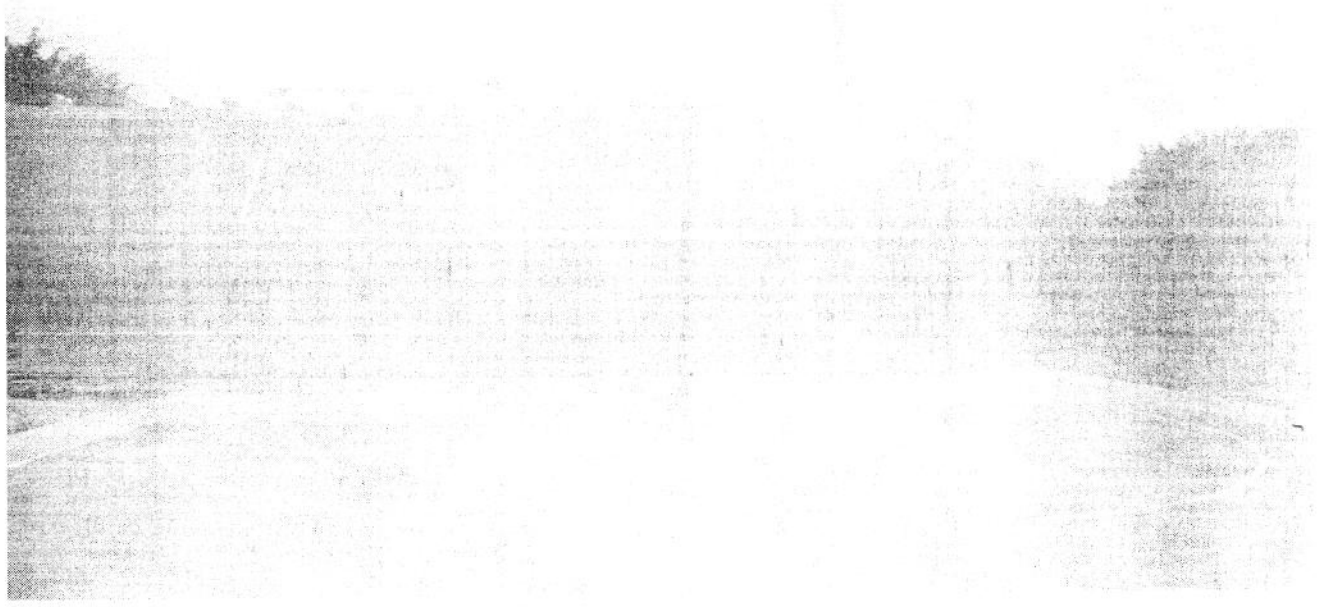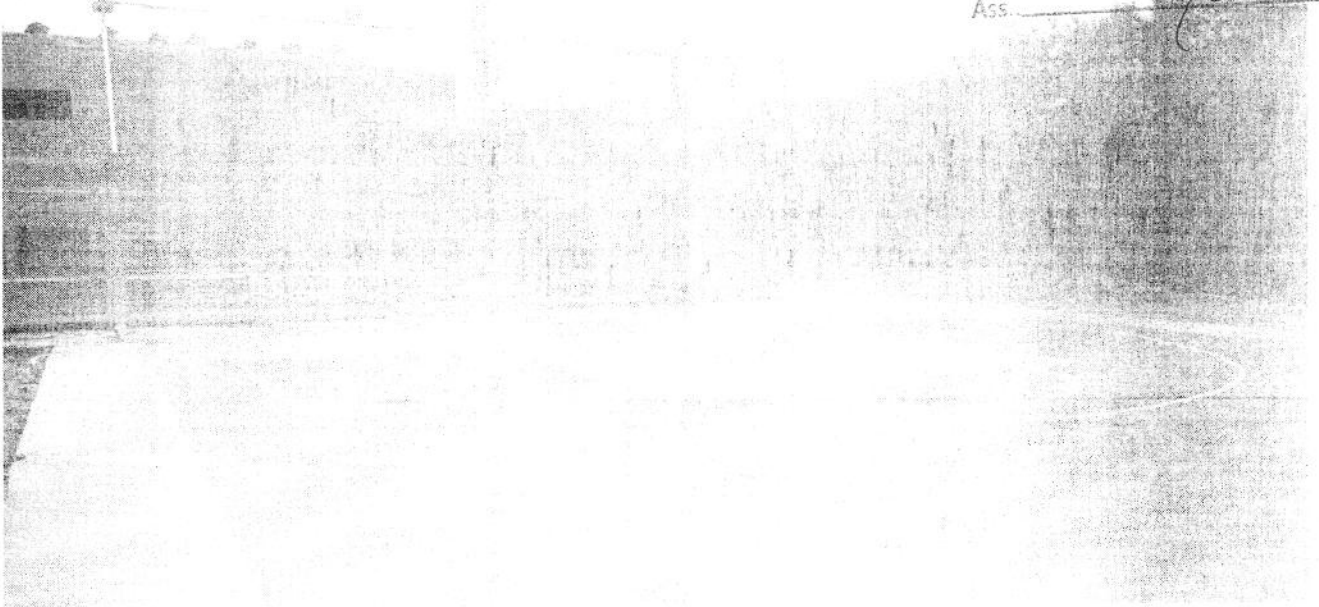

Fls nº 1024
 Proc. nº 1970
 Ass. WJ



4. PARECER

O parecer deste O Gestor da obra foi contratado. Não se observou a presença de quadra futebol, alambrado, iluminação, quadra de basquete, por toda a área executada de acordo com o projeto.

O projeto está de acordo com o que foi solicitado. O programa, estética, equipamentos para a quadra de basquete, tabela e pro e

dia 18 de setembro de 2020





Guayabo 27 de mar. de 2024.

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E FUSTAS - ACOES E PARTICIPACOES S.A.

Ata de Registro de Preços: 170/2011.

Quantidade: 405M

CEP: 35794-198

Quantidade: 544

CEP: 35790-300

Página 1 de 3

Fls nº 1027
Proc. nº 197
Ass. 170



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO

Avenida Integração São-Carlotto nº 100 - Centro - CEP: 35700-000 - Curvelo - MG

End.: Campo Mato da Engenheiro - Av. Agostinho Ribeiro - Rua Caboclinha - Bela Vista, Curvelo - MG

Quantidade: 184m²

CEP: 35794-556

End.: Parque bairro Ponte Nova - Rua Manoel de Jesus - 500 - 500 - 500 - Ponte Nova, Curvelo - MG

Quantidade: 515m²

CEP: 35795-529

End.: Parque bairro Boa Esperança - Rua da Boa Esperança - Boa Esperança, Curvelo - MG

Quantidade: 686m²

CEP: 35790-644

Endereço: Parque bairro Santa Rita - Rua Santa Rita - Santa Rita, Curvelo - MG

Quantidade: 395m²

CEP: 35792-730

End.: Parque bairro Santa Rita - Rua Santa Rita - Santa Rita, Curvelo - MG

Quantidade: 175m²

CEP: 35791-016

End.: Parque bairro Tibira - Praça Frei João de Deus - Tibira, Curvelo - MG

Quantidade: 70m²

CEP: 35790-042

End.: Praça do povoamento - 8 - Supermercado - Av. João Gonçalves Sérgio Engenheiro da Silva, 846 - Centro, Curvelo - MG

Página 2 de 3





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Avenida Integração, 50 - Centro - Curvelo/MG - CEP: 37.710-907 - curvelo@curvelo.mg.gov.br

Fls nº

1028

Página 4

Proc. nº

197

Ass.

Empresa Contratada: MMS Pireva Equipamentos e Instalações Esportivos S.A.

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Curvelo

CNPJ: 17.625.024/0001-05

Responsável Técnico: Márcio Roberto de Souza

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PR-75.550/D - RNP: 1700218073

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA COM AMORTECEDORES DE IMPACTO, 100% POLIÉTILENO, BASE DUPLO DETEX ENTRE 9000/11000, 8.000 PONTOS/M², MONOFILAMENTOS COMPRIMIDOS DE 52 MM, INCLUSIVE GRAMA SINTÉTICA PRONTA À OBRA, INSTALAÇÃO TOTAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), DESPESAS COM EQUIPE (ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E LOCOMOÇÃO), AREIA FINA E GRANULADO/AREIA DE BORRACHA PARA CONFORMAR O SISTEMA DE AMORTECIMENTO	2.975,00m²
	TOTAL GERAL:	2.975,00m²

Período:

Início: 07/04/2023

Entrega: 17/05/2024

Atenciosamente,

Alair José de Oliveira Junior

CPF: 123.456.789-05

Assessoria Técnica

CNPJ: 17.695.024/0001-05

RODRIGO VILLAS BOAS

Gerente de Obras


CPF: 713.456.789-01

Página 3 de 3



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, sob o nº 197, em 16/10/2024, em

De acordo com o artigo 10º do Regulamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, aprovado em 14/05/2014.



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

A MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

O MUNICÍPIO DE CAPANEMA possui a unidade de crédito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 75.972.760-0001 em, composta por: Assessoria Pedro Vinício Parigot de Souza, 1080 - Centro de Capanema-PR, Estado do Paraná, representado pelo Prefeito municipal, Sr. Américo Belle, inscritor no CPF de nº 340.595.879-45, que para todos os fins de direito o aceite da instalação do Piso Modular Esportivo FLEXOR pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 12.992.875-0001 23, tornando-se eficaz e produzindo efeitos estabelecidos no Termo de Contrato nº 323-2023, com base em ato nº 36-2023 e Resolução nº 45-2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

CEP: 85.75A(10)

Quantidade: 1700/9000

Título Profissional: Engenheiro Civil – Categoria 07 – R\$ 3.500,00 RNP: 1700318071

Fls nº 1030
 Proc. nº 197
 Ass. [assinatura]

Atestado de Capacidade - PR

mínima: 0,20 mm; Resistência a tração: 3,0 kgf/cm; Alongamento: 100%; Resistência a compressão: 25 kgf/cm; Adesão: Referência: 3M Pira - Adesivo 2000-100; Pira - Polipropileno Copolímero de alto impacto; Dimensões: 250mm x 250mm x espessura 1,2mm; De traco branco; 100% de adesão; Não é inflamável e/ou fixação; Superfície: não flexível; 100% de adesão; 100% de adesão; com polipropileno branco; 100% de adesão; 100% de adesão; 100% de adesão; e possui garantia de 10 anos.	
TOTAL GERAL:	R\$ 91.200,00

Período:
 Início: 29/01/2024
 Entrega: 27/03/2024

Município de Capaneua - Estado do Paraná - Sede da Rodovia Ecológica - Estrada
 Parque Caminho do Colono, s/nº 15 de setembro de 2024.

AMÉRICO BELLE
 Prefeito Municipal
 CPF nº 2.945.870-8
 MUNICÍPIO DE CAPANEUA
 R. N.º 15 de setembro de 2024

DIEGO ANDRÉ ROSSET
 Secretário Municipal de Esportes e Lazer
 CPF nº 2.945.870-8



PREFEITO MUNICIPAL
**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Fls nº 1051

Proc. nº 1017

Secretaria de Planejamento
Assessoria

Endereço: Rua Santos Dumont, 413, Centro - CEP: 89950-000
Fone: (41) 3644-0700 | (41) 3644-6711
E-mail: prefeitura@dionisioacerqueira.sc.gov.br

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Dionísio Cerqueira, 02 de setembro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA - pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 83.026.773/0001-74, com sede administrativa localizada na Rua Santos Dumont, 413, bairro Centro, CEP nº 89950000, neste ato, de Dionísio Cerqueira SC, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, o Sr (a) THYAGO WANDERLAN GUNATTO GONCALVES inscrito no cpf sob o nº 796.689.179-87, declara para todos os fins de direito o aceite da instalação de Piso Modular Esportivo **INDOOR e OUTDOOR** pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 27/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Arquivo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA:

Objeto do Contrato: Registro de preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de instalação de manta asfáltica e pro-módulos com fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento a demanda dos participantes do certame

- Empenho 741/2024 - 154,02 m² piso outdoor
- Empenho 742/2024 - 176,17 m² piso outdoor
- Empenho 916/2024 - 296,00 m² piso outdoor e 204,85 m² piso indoor

Endereços de instalação:

- Parque da Biblioteca Municipal - R. Nilsa Veronesi, 446-514 - Centro
- Escola Pinó do Gento - R. Prof. Adalberto Mangili, 179 - Centro
- Creche Isaura Motta - R. A. Antônio Ronder, 831 - Centro
- Creche Sonho Encantado - Rua X - s/d - Argemiro Pereira - Três Fronteiras
- Parque das Nações - Av. das Nações, 95 - Al. Ag. Nages
- Estádio Municipal - Rua Curitiba - João Zuccato, 501 - Centro

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Dionísio Cerqueira
CNPJ: 83.026.773/0001-74

Responsável Técnico: Maurício Antônio da Rocha Lima

Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: PB-79.30071 - RNP: 1700318071

DIONÍSIO CERQUEIRA

Página 1 de 3

juntos somos +



**DIONÍSIO
CERQUEIRA**

Fls nº

032

Secretaria de Planejamento
Projetos
Ass.

1970

Rua do Comércio, 413, Centro - CEP 89950-000
Fone: (41) 3644-5711
E-mail: dionisio@cerqueira.sc.gov.br

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
PISO MODULAR INDOOR COM MANTA PEBD 3,00 MM: Piso Modular Indoor Fornecimento e instalação. DO PISO INDOOR: Material: PP - Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência; Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm - O piso deverá ter um alojamento específico para parafuso na peça, permitindo a fixação do mesmo. Enxaxe: 100% - Instalação: 5 a 10 travas fêmea; Garantia: 10 anos; Aditivos de proteção: UV Supra e Anti-efluvia, resistência à umidade: 100%; Retorno de bola: 100% comparado ao concreto; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; Resistente a umidade, não forma limo. Aditivo Antiestática, não causa descarga por acúmulo de energia estática; Alto coeficiente de atrito (não escorrega inclusive molhado); Rápida montagem (2 dias); Piso atóxico. - Apresentar laudos emitidos por laboratório que comprovem a qualidade do piso modular: R\$ 195,30 438.250,00 - Resistência a tração mínima de 20 Mpa (ASTM D638:2014) Resistência a flexão 36Mpa (ASTM D790:17) Resistência a impacto mínima 25,5J (ASTM D5420:21)- Dureza Shore D70 (+/-0,5) (ASTM D2240:2014) Coeficiente de atrito dinâmico igual ou maior que 0,45 (ASTM D1894:14) - Capacidade de carga mínima de 15KN -Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com NBR NM 300-3:2004) DA MANTA PEBD: Esta manta proporciona maior agilidade e resistência quanto a instalação, proporcionando ainda os benefícios de amortecimento, memória programada (baixa deformação), rápida desmontagem e montagem. Denominação técnica: Espuma de células fechadas obtidas a partir da expansão de Polietileno de Baixa Densidade (PEBD) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NOMINAL/TOLERÂNCIA Espessura (mm) 3,0 (+/-0,2) Densidade (Kg/m³) 17 (+/-3) Espuma de Células Fechadas Absorção de Água Menor que 2% Benefícios que fazem a diferença da manta PEBD: Baixo peso e grande resistência; Isolante de umidade: não absorve água, mantendo os produtos secos; Isolante térmico: evita que variações térmicas excessivas afetem diretamente o produto; Excelente durabilidade; Alta estabilidade dimensional; Versatilidade de aplicações; Muitas possibilidades de transformações inclusive Manta PEBD 3mm, linhas demarcatórias de modalidades esportivas (basquete, vôlei e handebol), mão de obra de instalação, fretes e demais encargos, inclusive, das linhas demarcatórias de modalidades (futsal, basquete, vôlei e handebol), mão de obra de instalação, fretes e demais encargos. As cores da quadra e as demarcações serão combinados com o vencedor após o processo licitatório. OBSERVAÇÃO: A quadra modular é instalada sobre a base atual (piso atual da quadra), porém possui a necessidade de espaçamento das paredes para o trabalho e instalação da manta correta. Por esse motivo, as dimensões da quadra modular quando possível, devem ser feitas em paredes nas extremidades são executadas com uma pequena diferença de 10cm das extremidades atuais da quadra existente. Esse modo de execução é obrigatório para o andamento correto do desempenho da quadra, evitando patologias nas placas ao sofrerem a dilatação natural climática.	201,35m²
PISO OUTDOOR - Fornecimento e instalação do piso modular outdoor: DO PISO OUTDOOR Material: PP Polipropileno Copolímero de alto impacto e alta resistência. Dimensões: 250mm x 250mm x 12mm (Garantia: 10 anos. Aditivos de proteção: UV Sistema de trava antifurto Resistência a arrancada: 100% Alta resistência mecânica. Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional. Resistente a umidade, não forma limo. OBSERVAÇÃO ESPORTIVA Demarcação com fita flexível bi-empilhante a base de PU. Bordas sólidas (20 +/- 2%) / Espessura úmida (10 a 30 microns) / Fita Sólida (40 +/- 2%) / Espessura úmida (80 microns) / Veículo PU-arrastor e aplicação especial. Aplicado com rolo especial.	627,12m²

junior semos



DIONÍSIO
CERQUEIRA

Fls nº 1033
Secretaria de Planejamento

Projetos

Ass: 197
Dionísio Cerqueira - CEP 89050-000
Fone: (41) 3644-6711
dionisio@cerqueira.sc.gov.br

Apresentar Laudos emitidos por laboratório que comprovem a qualidade do piso modular outdoor: - Resistência à Tração (média) 510,00 N (ASTM D638:2014) R\$ 188,00 R\$ 470.000,00 Aditivos de proteção UV, Anti-ox, Sistema de trava antifurto; Resistência à umidade: 100%; Alta resistência mecânica; Alta absorção de impacto; Baixa absorção de calor; Baixa amplitude dimensional; resistente a umidade, não forma lixos; Aditivo Amestral, não escurece e protege por ação de energia estática; Alto coeficiente de atrito (antideslizante, inclusive molhado) Rápida montagem; Drenante. Laudos emitidos por laboratório que comprovem a qualidade do piso modular outdoor: - Resistência à Tração (média) 510,00 N (ASTM D638:2014) - Resistência à Flexão/Deformação (média) 39,00 N (ASTM D790 - 17) - Resistência à Compressão 1.735,00 Kgf (ASTM D695) - Dureza shore D41 (+/- 3,2 (ASTM D2240:2014) - Resistência a alta temperatura (600°C por 72hrs) Sem alteração (Ensaio Laboratório) - Coeficiente de atrito estático (com óleo) 0,60 (ASTM 1894:14) - Coeficiente de atrito dinâmico (com óleo) 0,50 (ASTM 1894:14) - Piso atóxico (NBR 16071-2:2020 com ABNT NBR 6-0-0-0-0-0) Atende a ABNT NBR 16071-3: 2021. DA DEMARCAÇÃO: Tinta: aplicação por eletroímã; bi-componente à base de PU. Primer: sólidos (20 +/-2%) / Espessura úmida 180 microns; Tinta: sólidos (40 +/-2%) / Espessura úmida 180 microns / Veículo PU acrílico e planar alifático. Aplicado com rolo especial. O layout e as demarcações rúbricas e recreativas serão combinados com o vencedor após a proposta.

Período:

Início: 16/02/2024

Entrega: 30/08/2024

Atenciosamente,

GUILHERME
HENRIQUE
MAPA
LIBARDON 0089
3772980
GUILHERME LIBARDON
SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO
(CRLP - C 410 441-2)

DIONÍSIO CERQUEIRA

juntos vamos +

Fls nº 1034
SSO 1977
Proc. nº 40
Ass: _____

10/24/2023

[illegible]

Contrato: 245077

Contrato: 002467-2019

Objeto do Contrato: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PAVILÃO DE INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - MONTECARLOS DO SUL - PARANÁ.

Endereço da Obra: Pólo 1, 2 e 3, Av. ...

CEP: 44 695 005

Quantidade: 500

Endereço da Obra: _____

CEP, 44:695-700

Quantidade: 150/177

Empresa Contratada: MANTENIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CNPJ: 17.932.779/0001-24

Contract date: 02/06/12 Page 2 of 10

CNPJ: 31.359.192/0001-70

[illegible]

Título Profissional: Engenheiro de Edifícios

ART n° 24223061-810

Atividades executadas/Descritivo:

Atividades executadas		Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
ITEM	DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS		R\$	R\$
1	GRAMA SINTÉTICA MONOFRASEADA - VERDE - 60x60cm - PRETO - 10mm COM INSTALAÇÃO (GRAMA VERDE + GRAMA BRANCA) - 255.000,00	3000m²		
			TOTAL GERAL:	255.000,00

Período:

Atenciosamente,



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Fls nº

Proc. nº

Ass.

1035
197
197

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007456

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Crea-PR, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MAURICIO BELINOVSKI FERREIRA DE LUCA

Registro: PR-78330/D

RNP: 1709318071

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720240007456 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2024 Baixa em: 02/10/2024 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: MMS PINOYA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

Contratante: MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL - CEP: 76.105.667-000

Rua: AV. BRASIL Nº 38

Complemento: Bairro CENTRO

Cidade: AGUDOS DO SUL - UF: PR - CEP: 83850-000

Contrato: 272024 celebrado em 06/06/2024

Valor do contrato: R\$ 118.550,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA DO ARAUCÁRIAS 1500

Complemento: GINÁSIO TIO PIRI - Bairro CENTRO

Cidade: AGUDOS DO SUL

UF: PR

CEP: 83850-000

Coordenadas Geográficas: -25.858334 x -49.380389

Data de início: 07/06/2024 Conclusão efetiva: 07/07/2024

Finalidade: Esportivo

Proprietário: MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL

CNPJ: 176.105.667/0001-10

Atividade Técnica 1: Execução de instalação de estrutura de portos molares - 243 M2

Observações:

INSTALAÇÃO DE PISO MODULAR INTERIOR (PVC) PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS)

Observações da entidade:

O Crea-PR certifica os dados da ART

O atestado anexado foi assinado eletronicamente

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra aprovado o presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720240007456/2024

02/10/2024 15:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 061 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



Certidão de Arquivo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720240007456

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perdura a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo 276056/2024.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva pena penal.

Fls. nº

1036

Proc. nº

197

Ass.

[Assinatura]



Fls nº 1037**PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, nº 38, Centro, Fone: (41) 3624.1244, CEP: 83850-000
Agudos do Sul – PR CNPJ 76.105.667/0001-10**ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS**

Agudos do Sul, 05 de julho de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.105.667/0001-10, com sede à Av. Brasil, nº 38, Centro, Agudos do Sul/PR, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JESSE DA ROCHA ZOELLNER, brasileiro, residente e domiciliado nesta cidade, declara para todos os fins de direito o aceite da **Instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR**, pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no CONTRATO Nº 22/2024, RESOLUÇÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2024, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim do efeito no Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Objeto do Contrato: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de revestimento intertravado no piso do ginásio de esportes Tico Pires, com área total de 741,00m².

Endereço da Obra: Ginásio Tico Pires – Rua Fausto Fagundes, S/n – Centro, Agudos do Sul PR

CEP: 83850-000

Quantidade: 741,00M²

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Agudos do Sul

CNPJ: 76.105.667/0001-10

Responsável Técnico: Mauricio Belinowski Ferreira de Azevedo

Título Profissional: Engenheiro Civil – Carteira: PR-79.380/0 – RMP: 1700318071

ART: 1720243349335

Atividades executadas/Descritivo:

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
Instalação e fornecimento de revestimento intertravado projetado para utilização em ambientes internos fabricado em polipropileno virgem de alto impacto, com a medida mínima de 150mm x 200mm x 11mm (comprimento x largura x altura), cada peça com no mínimo, 24 conexões para melhor fixação entre elas. Com proteção ultravioleta, que garanta alta durabilidade, comprovada por ensaio de	741	m²



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, nº 38, Centro, Fone: (41) 3624.1244, CEP: 83850-000
Agudos do Sul - PR CNPJ 76.105.667/0001-10

Fls nº

1038

Proc. nº

1037

intemperismo, a serem apresentados juntamente com os documentos de habilitação, de 600 horas, com cor e integridade sem alteração, de acordo com a norma ASTM A 155, realizado por laboratório acreditado pelo Inmetro, as placas deverão contar com proteção anti-oxidação, antiestática e se em 2000 resistências à tração, a junta fixa deve possuir tratamento antiderrapante que garanta estabilidade aos utilizadores tanto no seco quanto no molhado, é necessário também que as placas contenham sistema de absorção de impactos, fabricado em elastômero do tipo tpe, capaz de afastar a peça do solo entre 1 e 2mm, garantindo também estabilidade aos utilizadores, tal sistema deve ser fixado.

Período:

Início: 07/05/2024

Entrega: 05/07/2024

Atenciosamente,

JESSE DA ROCHA

ZOELLNER09157

138973

Assinado eletronicamente

por JESSE DA ROCHA

CPF: 09157389730

Assinado em 07/05/2024

IP: 191.161.100.1

JESSE DA ROCHA ZOELLNER

Presidente Municipal

MUNICÍPIO DE AGUDOS DO SUL

CNPJ 76.105.667/0001-10

GUILHERME JOSE MOLETTA:05339182940

Assinado eletronicamente por GUILHERME JOSE

CPF: 05339182940

Assinado em 07/05/2024

IP: 191.161.100.1

Guilherme Jose Moletta

Eng. Civil CREA-PR 123432/3

Responsável Técnico do Município

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Pato Branco, 10 de outubro de 2023.

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 26.985.448/0001-24, estabelecida na Rua Cararamita nº 271, Centro, em Pato Branco - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Anderson Lantu, brasileiro, portador do RG nº 1.816.183-4 SE/P/PR, inscrito no CPF nº 033.333.333-00, residente e domiciliado na Rua Argentina nº 02, Apto. 702, Bairro Jardim das Américas, Cel. N5 St. 2-040, declara para todos os fins de direito o aceite da instalação de Piso Modular pela empresa MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A, devidamente inscrita sob CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos, na Ata de Registro de Preços nº 212/2023, cuja licitação foi promovida através de Pregão Eletrônico nº 53/2023; Processo 105/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito no que se refere ao Anexo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.174/2019 do Conselho.

Ata de Registro de Preços: 212/2023

Objeto do Contrato: Instalação do Registro de Preços para futura, eventual e fracionada aquisição com instalação de aparelhos para Parque Infantil Indoor, Parque Infantil Outdoor, Parque Infantil de Cordas, Pisos JBR, Equipamentos, Pisos, Pisos, Pisos Outdoor, Pisos Polipropileno Indoor e mobiliários urbanos em madeira, plástico, alumínio e suas necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação e Cultura e Secretaria de Meio Ambiente.

Área total de 3.250,00m².

Quantidade: 800,00m²

CEP: 85504-576

End.: Ginásio do bairro Jardim das Américas - Rua Cararamita nº 271 - Caixa Postal 200, aos fundos da Escola Municipal Antonio Caderin.

Quantidade: 594,00m²

CEP: 85506-523

End.: Ginásio do bairro Jardim das Américas - Rua Cararamita nº 271 - Caixa Postal 200, aos fundos da Escola Municipal Antonio Caderin.

Quantidade: 1056,00m²

CEP: 85506-520

End.: Ginásio do bairro Industrial - Rua Industrial nº 2.275 - Setor Industrial, aos fundos da Escola Municipal Olavo Bilac.

Quantidade: 800,00m²

CEP: 85506-210

End.: Ginásio do bairro Morumbi - Rua Iguaçu nº 200 - Santa Maria, CN - Morumbi, Pato Branco PR.

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A.

CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Pato Branco

CNPJ: 26.985.448/0001-24



Responsável Técnico: Mauricio Belinowski Ferreira de Lencastre
 Título Profissional: Engenheiro Civil - Carteira: P1 79-42910 - RNP: 1700318071

Atividades executadas/Descritivo:

ITEM	DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS	QUANT.
1	Piso Modular Esportivo Outdoor. Piso para áreas externas. Produzido em polipropileno (pp) virgem de alto impacto, encabe tipo macho-fêmea com, pelo menos, 14 conexões macho e 14 conexões fêmeas para melhor fixação entre as placas; peça com medida mínima de 250mm x 250mm x 11mm (comprimento x largura x altura), o espaçamento entre as placas deve ser projetado de tal forma que, a quadra, quando montada, tenha todas as demarcações das linhas perimetrais coincidentes com os limites da placa, tal exigência se faz necessária pois as quadras terão no mínimo duas cores e não será permitido que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisão das quadras deverá ser feita exclusivamente com peças inteiras dos pisos, as peças deverão possuir capacidade de absorção e escoamento de água para utilização em quadras externas; proteção ultravioleta (uv) com solidez a luz alta, com proteção anti-oxidação 100% de resistência a umidade, superfície com tratamento antiderrepante, cores a definir no ato da emissão da ordem de empenho/fornecimento; demarcações das linhas para futebol, handebol, basquete, voleibol em tinta ou adesivo, com promotor de aderência; acabamento das bordas no mesmo material com suavização do degrau através de rampas de acesso; os pisos intertravados em quadras esportivas, externas, internas e playground devem possuir sistema de encaixe que possibilite que sejam intercambiáveis entre si. Ou seja, que possam ser substituídas em áreas danificadas, com prazo mínimo de 05 (cinco) anos. Instalado.	800,00m²
2	Piso Modular Esportivo Indoor. Produzido em polipropileno (pp) virgem de alto impacto, encabe tipo macho-fêmea com, pelo menos, 14 conexões macho e 14 conexões fêmeas para melhor fixação entre as placas; peça com medida mínima de 250mm x 250mm x 11mm (comprimento x largura x altura), o piso deve ser instalado mantendo a profundidade de encaixe de 11mm, as juntas serão preenchidas com poluretano, com no mínimo 30mm de espessura e densidade não inferior a 900g/cm³, o espaçamento entre as placas deve ser projetado de tal forma que, a quadra, quando montada, tenha todas as demarcações das linhas perimetrais coincidentes com os limites da placa, tal exigência se faz necessária pois as quadras terão no mínimo duas cores e não será permitido que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisão das quadras deverá ser feita exclusivamente com peças inteiras dos pisos; peça com proteção 100% de resistência anti-oxidação, proteção ultravioleta (uv) com solidez a luz alta, com proteção anti-oxidação 100% de resistência a umidade, superfície com tratamento antiderrepante, cores a definir no ato da emissão da ordem de empenho/fornecimento; demarcações das linhas para futebol, handebol, basquete, voleibol em tinta ou adesivo, com promotor de aderência; acabamento das bordas no mesmo material com suavização do degrau através de rampas de acesso; os pisos intertravados em quadras esportivas, externas, internas e playground devem possuir sistema de encaixe que possibilite que sejam intercambiáveis entre si. Ou seja, que possam ser substituídas em áreas danificadas, com prazo mínimo de 05 (cinco) anos. Instalado.	2.450,00m²
TOTAL GERAL:		3.250,00m²

Período:

Início: 27/06/2014

Encerramento: 10/09/2014

Atenciosamente,



Davi Kressold
Secretário de Esportes e Lazer
Município de Pato Branco
CNPJ: 06.905.448/0001-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

Fls nº 1042
Proc. nº 197
Ass. [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, atesta para os devidos fins, o aceite da instalação de Piso Modular Esportivo Indoor pela empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos na Ata de Registro de Preços 254/2023, com licitação através do Pregão Presencial nº 028/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais, para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA.

Ata de Registro de Preços: nº 254/2023

Objeto do Contrato: Fornecimento e instalação de piso esportivo, grama sintética e preparação de base para aplicação.

Endereço da Obra: Ginásio Jerivó - Rua Florai, 2728 - Alto Tarumã - Pinhais/PR
CEP: 83325-380

Endereço da Obra: Ginásio Berdizes - Rua Arlindo Jantar, 810 - Atuba - Pinhais/PR
CEP: 83326-070

Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Pinhais
CNPJ: 95.423.000/0001-00

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	PISO ESPORTIVO INTERTRAVADO PARA QUADRAS ESPORTIVAS INTERNAS, COM INSTALAÇÃO. Produzido em polipropileno (PP) virgem de alto impacto. Encaixe tipo macho-fêmea por, no mínimo, 14 conexões macho e 14 conexões fêmeas para melhor vedação entre as placas. Peça com medidas nominais de 250cm x 250cm x 1,5cm (comprimento X largura X altura). O espaçamento entre as placas deve ser projetado de tal forma que, na quadra, quando montado, tenha todas as demarcações das linhas perimetrais coincidentes com os limites de placa; tal exigência se faz necessária pois as quadras terão no mínimo duas cores e não será admitido que os pisos sejam pintados de forma corretiva. A divisão das quadras deverá ser feita exclusivamente com peças inteiras dos pisos. Peça com peso mínimo de 100g para maior estabilidade. Proteção Ultravioleta UV, com índice > 100. Com proteção anti-oxidação, 100% de resistência química. Superfície com tratamento antideslante. Tratamento antistático, conforme normas do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, comprovados por meio de ensaios realizados por laboratório credenciado (INMETRO), que serão fornecidos juntamente com AS ANEXO 13, que prevê os seguintes pontos: 1) Tipo crítico de acidente: 2) NBR 2890, deve ser maior ou igual a 8000; 3) Coeficiente de atrito: 0,15; 4) EN ISO 11325-2, deve ser maior ou igual ao valor de 15000 em 20 segundos; 5) densidade (pico) mínima média mínima de 150 pontos, conforme ASTM D 672. Cores de alto contraste em relação à cor de fundo da empilhadeira. Demarcações de linha para futebol.	1218,36	M²



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAÍS
ESTADO DO PARANÁ

Fls nº

1003

Proc. nº

197

40

	handebol, basquete, voleibol em linha P.V. industrial com promotor de aderência; Acabamento das bordas no mesmo material com suavização do degrau através de rampas de acesso. O piso deve ter homologação válida, que deverá ser fornecida juntamente com a AFROSTRA por no mínimo uma entidade de esporte de abrangência nacional (Confederação Brasileira) ou internacional (Federação Internacional) nas modalidades de futsal, handebol, basquete ou voleibol. Os pisos inter-travessos para quadras esportivas internas e externas devem possuir sistema de encaixe que possibilite que sejam intercambiáveis entre si. Ou seja, que possam ser combinados em áreas contínuas.		
2	MANTA PARA CONTRAPISO COM INSTALAÇÃO. Manta para contrapiso esportivo, pre-fabricada, fornecida em rolos com espessura de 3mm (mínimo, 100% reciclável em PEBA (Polietileno de Baixa Densidade).	1185,92	M²

Período

Início: 06/05/2024

Entrega: 25/07/2024

Pinhaís, 04 de outubro de 2024



André Henrique Bassetti Salles dos Santos
Diretor do Departamento de Lazer,
Inclusão e Qualidade de Vida



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, inscrita no CNPJ sob nº. 76.105.543/0001-35, sediada à Rua Passos da Oliveira, nº 1101 – Centro, São José dos Pinhais – PR, atesta para os devidos fins que a empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº. 17.992.979/0001-24, sediada na Rua Haroldo Pacheco e Silva, nº. 197 – Sala 03, Bairro Vila Ipojuca, São Paulo – SP, Responsável Técnico: **Maurício Belincovski Ferreira de Luca**, Título Profissional: Engenheiro Civil – Carteira: PR-79.330/D – RNP: 1700318071, forneceu a instalação de grama sintética, conforme consta nos quantitativos abaixo descritos:

Pregão Eletrônico nº 011/2022 – SERMAU

Ata de Registro de Preços nº 051/2022 – SERMAU

Objeto: Aquisição de piso intertravado, piso em borrachado e grama sintética e suas devidas instalações nas quadras e campos da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Educação.

Item	Descrição dos serviços	Quantidade
1	Grama sintética em borrachado para campo de futebol com, no mínimo, 50mm de altura. Rua Moacir Tomella, 149 – Colônia Rio Grande, São José dos Pinhais PR. 500m² Rua Serafim David Ribeiro, 7332 – Ipê, São José dos Pinhais PR. 580 m² Rua Casemiro Greboge, 181 – Ipê, São José dos Pinhais PR. 570 m² Rua Maria Helena, 707 – Bragá, São José dos Pinhais PR. 603,33 m²	2553,33 m²
TOTAL GERAL:		2553,33 m²

Período de instalação:

Data de início: 30/09/2022

Data de término: 21/09/2023

Fls nº 1046

Proc. nº 197

Ass. *[assinatura]*



Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais

ESTADO DO PARANÁ

Informamos que os serviços foram entregues dentro dos prazos, padrões de qualidade e finalidades pré-estabelecidas, atendendo a todos os requisitos exigidos. Até a presente data, não temos em nossos arquivos nada que desabone a conduta da referida empresa, comprovando sua capacidade técnica para os serviços contratados.


São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

[assinatura]
Marcel Gleitenberg da Rocha
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
Matrícula: 18794



[assinatura]
Jorge Luiz Muelh de Mattos
RNP: 2003801058
Engenheiro Civil



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

ESTADO DO PARANÁ

Fls nº 1047

Proc. nº 197

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Cândido de Abreu, 06 de setembro de 2024

À MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A

O MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU, inscrito no CNPJ nº. 76.175.926/0001-80, com endereço à Avenida Paraná, nº 03, Centro, Cândido de Abreu-PR, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. RENAN MENCK ROMANICHEN, brasileiro casado, portador de cédula de identidade nº. 8.798.161-4 SSP/PR e CPF/MF nº. 059.071.679-47, declara para todos os fins de direito o **aceite da Instalação de Piso Modular Esportivo INDOOR** pela empresa **MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 17.992.979/0001-24, dentro das especificidades e padrões estabelecidos no Contrato Nº 33/2023, Pregão Eletrônico Nº. 09/2023, dando por fim a conclusão e recebimento.

Ademais para fim de efeito na Certidão de Acervo Técnico, registra-se abaixo para atendimento da Resolução 1.137/2009 do CONFEA

Contrato: nº 33/2023

Objeto do Contrato: Fornecimento e Instalação de piso esportivo modular, em atendimento à Secretaria Municipal de Esportes e Turismo.

Endereço da Obra: Quadra do bairro Areão, SN - Areão, Cândido de Abreu, a 35 km da cidade
CEP: 84470-000

Quantidade: 720,00m²


Empresa Contratada: MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A
CNPJ: 17.992.979/0001-24

Contratante: Município de Cândido de Abreu
CNPJ: 76.175.926/0001-80

Responsável Técnico: Mauricio Belinovski Pereira de Luca

Título Profissional: Engenheiro Civil Carteira: PR 79.236/D RNP: 1700318071

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
Piso esportivo modular INDOOR: Piso indoor modulares feitos de polipropileno copolimerizado virgem (não reciclado). Cada peça deve medir, no mínimo, 25 cm x 25 cm x 1,2 cm, com peso mínimo unitário de 250g. Os pisos modulares serão instalados sobre uma manta PEBD de alta densidade de 5 mm. Seu modo de instalação ocorrerá através de um sistema de travamento com encaixes tipo macho / fêmea entre as peças do piso, garantindo a mínima existência possível de vão entre as placas. O sistema deve ser instalado a fim de manter a estabilidade do piso	720,00m ²



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
ESTADO DO PARANÁ

Fls nº 1048
Proc. nº 197

Ass. [assinatura]

independente de variações de temperatura do ambiente de instalação. As peças deverão ter tratamento UV e anti-oxidação de modo a manter a cor original do piso por muitos anos e facilitar sua limpeza. Deverá ter acabamento fosco (cores a definir) e ser demarcado para a prática dos seguintes esportes: vôlei, futsal, basquete e handebol. Garantia de no mínimo 10 (dez) anos. Este piso deve ser instalado sobre o piso de concreto existente no local, incluso: Manta 6mm, pintura das linhas (futsal, vôlei, basquete e handebol), mão de obra de instalação, fretes e demais encargos. As cores da quadra e a pintura das linhas serão combinados com o vencedor após o processo licitatório.

Período:

Início: 04/07/2024

Entrega: 02/09/2024

Atenciosamente,

RENAN MENCK
ROMANICHEN:0590
7167947

Assinado eletronicamente por:
RENAN MENCK
ROMANICHEN:05907167947
Data: 2024.09.06 15:12:15 -03:00

RENAN MENCK ROMANICHEN

CPF sob o nº 059.071.673-47

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE CÂNDIDO DE ABREU

CNPJ: 76.375.926/0001-80

WILLIAN RAFAEL
KINDZIERA:10451391900

Assinado eletronicamente por WILLIAN
KINDZIERA:10451391900
Data: 2024.09.06 15:41:53 -03:00

WILLIAN RAFAEL KINDZIERA

CREA-PR 135510/D

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL DO MUNICÍPIO
